甲府市浄化センター水処理施設運転管理等
業務委託 資料集

甲府市上下水道局

目　　次

資料1　業務範囲
(1)甲府市浄化センター平面図・・・・・・・・・・・・・・・1
(2)住吉中継ポンプ場平面図・・・・・・・・・・・・・・・・2
(3)池添ポンプ場平面図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3

資料2　下水道排除基準表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4

資料3　工事修繕関係
(1)処理場施設改築計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
(2)水処理施設修繕計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
(3)甲府市浄化センター建設工事台帳・・・・・・・・12
(4)甲府市浄化センター工事及び修繕履歴・・・・31

資料4　諸業務
(1)処理設備関係 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34
(2)建築設備関係 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・93
(3)分析関係 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・124

資料1

業 務 範 囲

(1)甲府市浄化センター平面図

(2)住吉中継ポンプ場平面図

(3)池添ポンプ場平面図

(1)甲府市浄化センター平面図

浄化センター平面図

S=NON

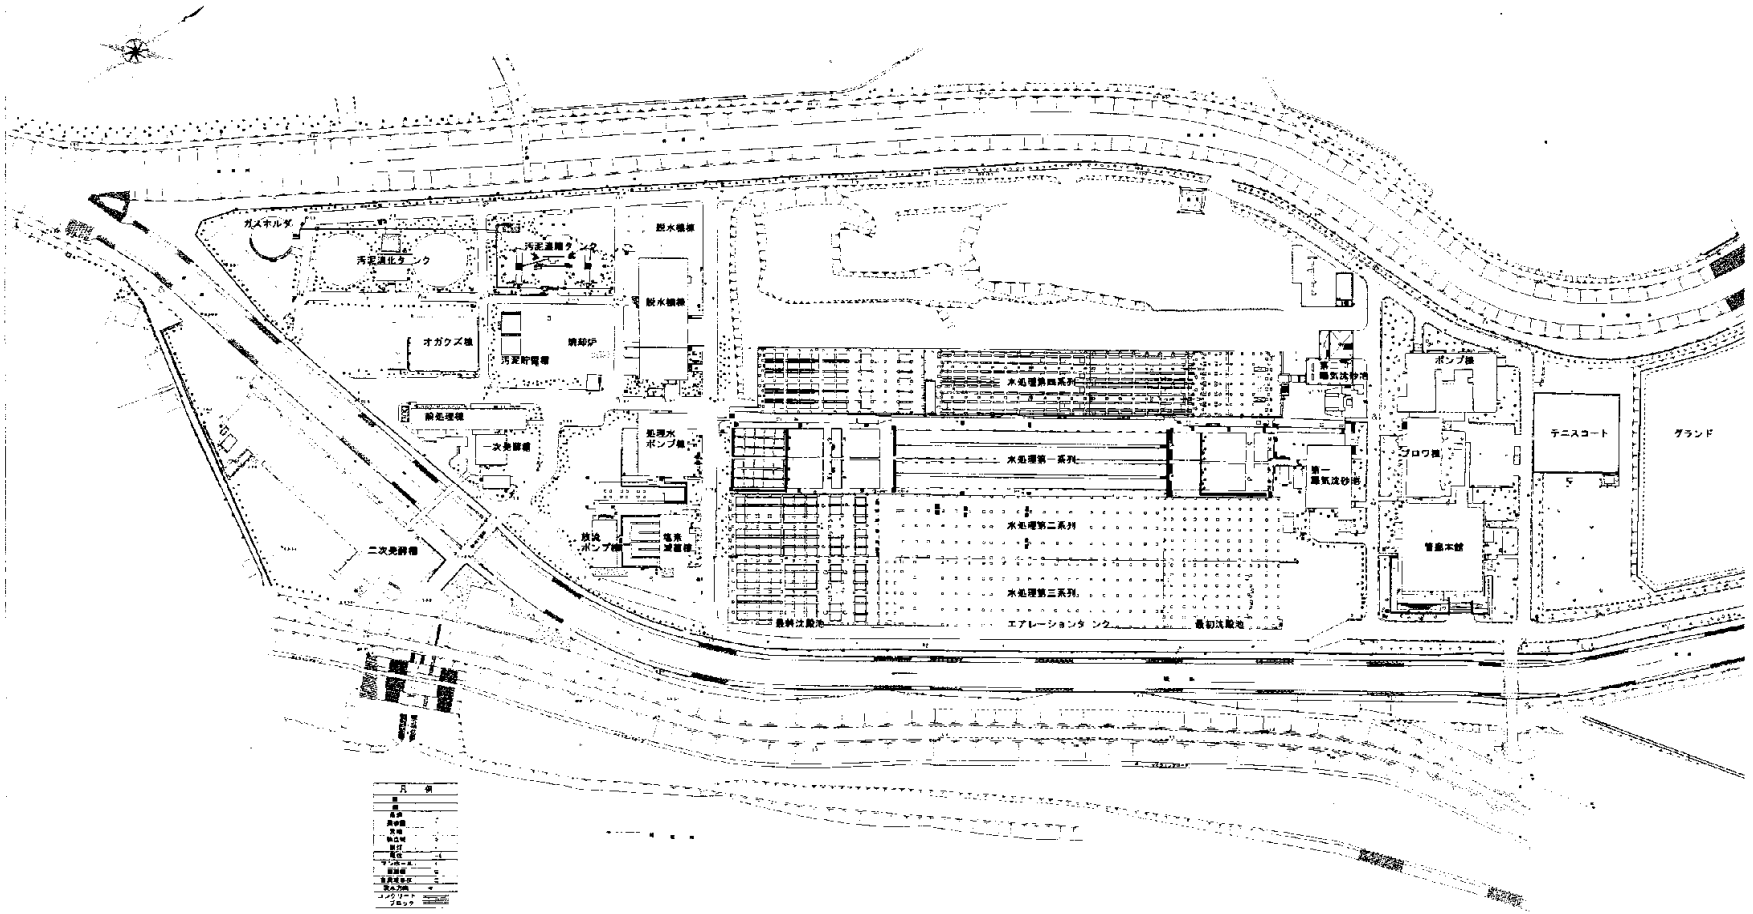

(2)住吉中継ポンプ場平面図

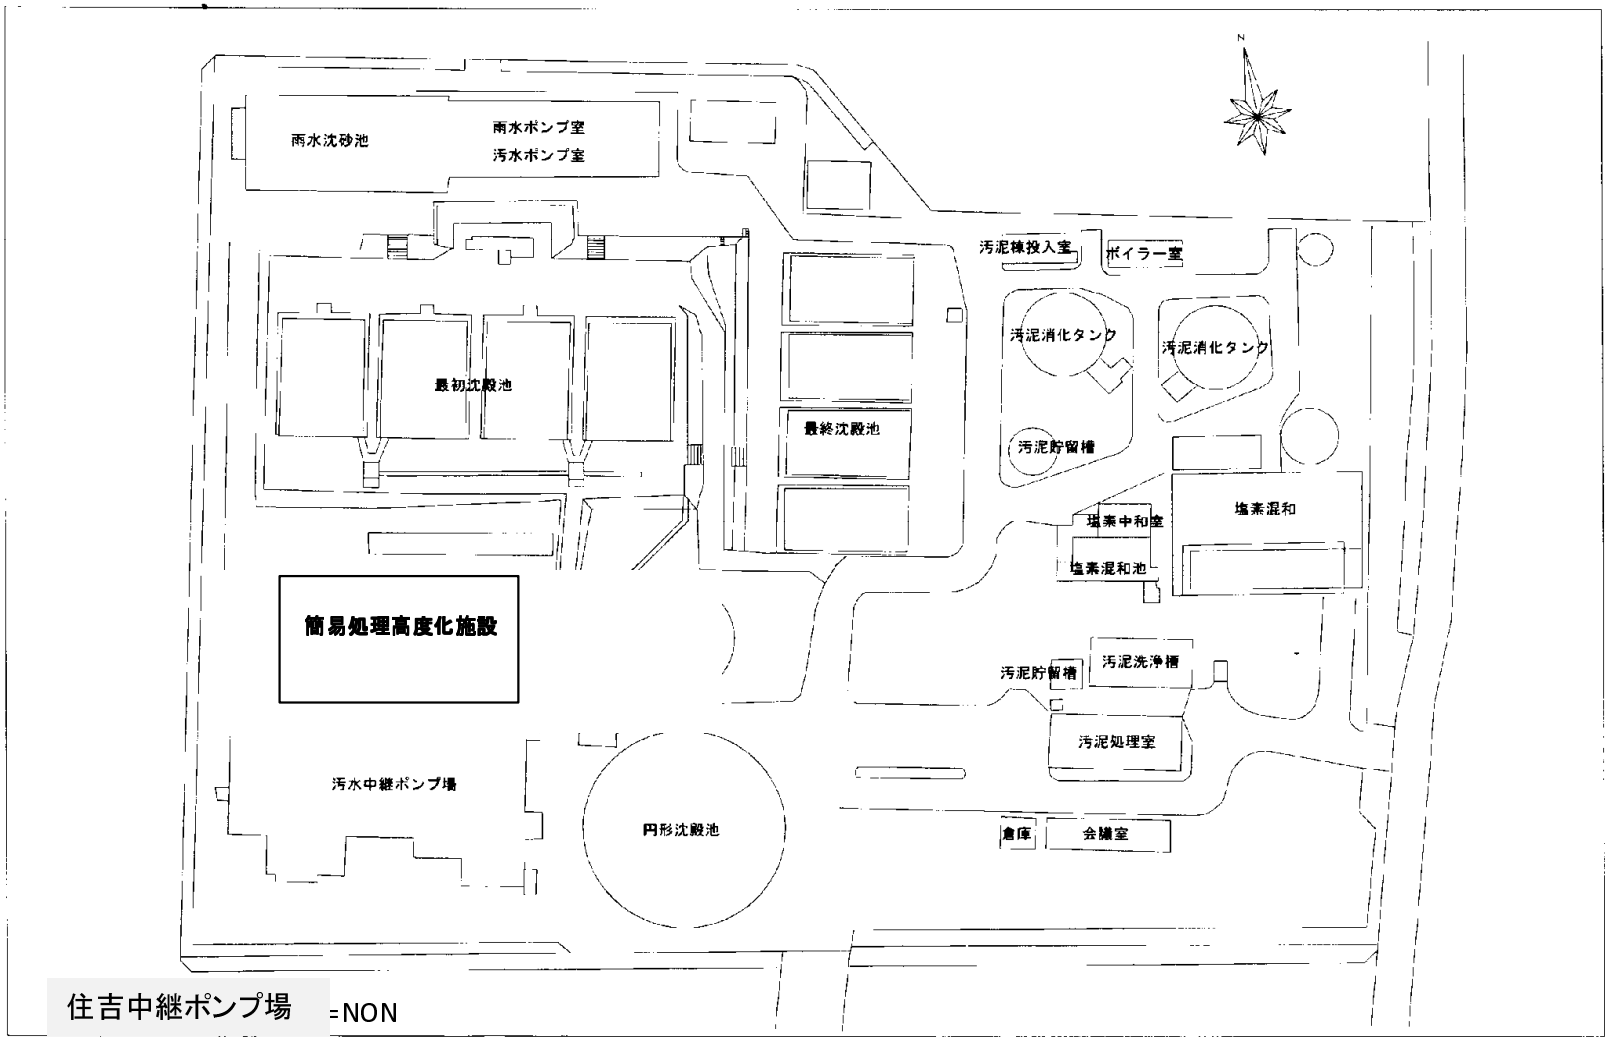

住吉中継ポンプ場 =NON

(3)池添ポンプ場平面図

池添ポンプ場

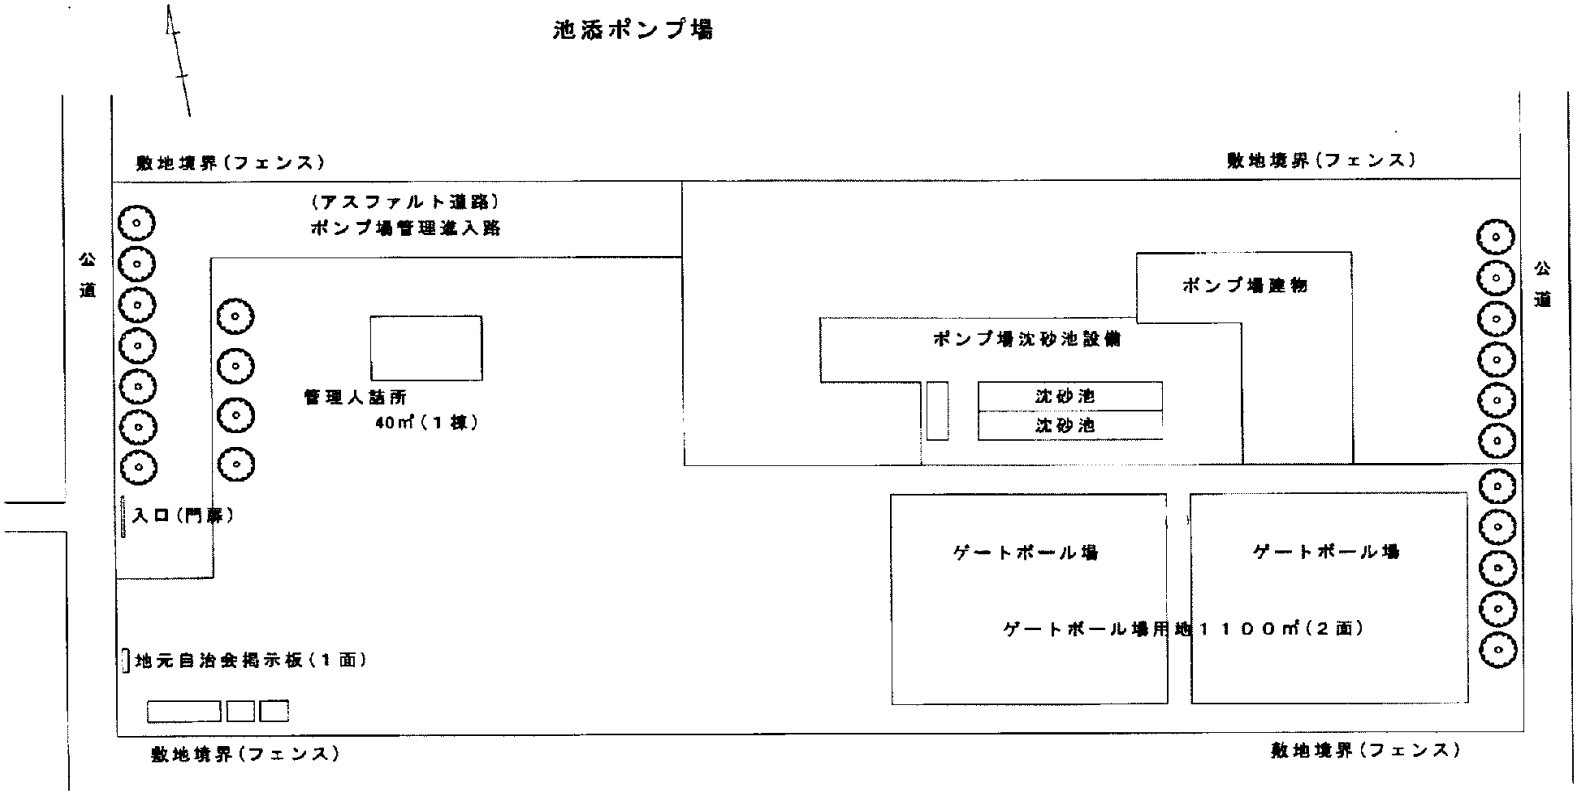
敷地境界(フェンス)
敷地境界(フェンス)
(アスファルト道路)
ポンプ場管理進入路
公道
公道
ポンプ場建物
ポンプ場沈砂池設備
沈砂池
沈砂池
管理人詰所
40㎡(1棟)
入口(門扉)
ゲートボール場
ゲートボール場
ゲートボール場用地1100㎡(2面)
地元自治会掲示板(1面)
敷地境界(フェンス)
敷地境界(フェンス)

S=NON

資料2

下 水 道 排 除 基 準 表

下 水 道 排 除 基 準 表

対象項目			特定施設設置事業場			特定施設の無い事業所		
			50㎥/日以上	50㎥/日未満20㎥/日以上	20㎥/日未満	50㎥/日以上	50㎥/日未満20㎥/日以上	20㎥/日未満
健康項目	カドミウム	mg/L	検出されないこと			検出されないこと		
	シアン	mg/L	0.1			0.1		
	有機リン	mg/L	検出されないこと			検出されないこと		
	鉛	mg/L	0.1			0.1		
	6価クロム	mg/L	0.05			0.05		
	砒素	mg/L	0.05			0.05		
	水銀	mg/L	0.005			0.005		
	アルキル水銀	mg/L	検出されないこと			検出されないこと		
	ポリ塩化ビフェニル	mg/L	0.003			0.003		
	トリクロロエチレン	mg/L	0.3			0.3		
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.1			0.1		
	ジクロロメタン	mg/L	0.2			0.2		
	四塩化炭素	mg/L	0.02			0.02		
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	0.04			0.04		
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.2			0.2		
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.4			0.4		
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	3			3		
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	0.06			0.06		
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L	0.02			0.02		
	チウラム	mg/L	0.06			0.06		
	シマジン	mg/L	0.03			0.03		
	チオベンカルブ	mg/L	0.2			0.2		
	ベンゼン	mg/L	0.1			0.1		
	セレン	mg/L	0.1			0.1		
	ホウ素およびその化合物	mg/L	10			10		
	フッ素およびその化合物	mg/L	1(既設は5)		8	1(既設は5)		8
	ダイオキシン類	pg/L	10			10		
	アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素および硝酸性窒素含有量	mg/L	380			380		
生活環境項目	クロム	mg/L	0.5(既設は1)			0.5(既設は1)		
	銅	mg/L	1			1		
	亜鉛	mg/L	1			1		
	フェノール類	mg/L	1			1		
	溶解性鉄	mg/L	1(既設は5)			1(既設は5)		
	溶解性マンガン	mg/L	1			1		
	BOD	mg/L	600			600		
	SS	mg/L	600			600		
	ﾍｷｻﾝ抽出物質(鉱類)	mg/L	5			5		
	ﾍｷｻﾝ抽出物質(動植)	mg/L	30			30		
	pH	---	5～9			5～9		
	温度	℃	45			45		
	ヨウ素消費量	mg/L	220			220		

特定施設とは、水質汚濁防止法により定められたガソリンスタンドの洗車機などの施設をいいます。

*フッ素及びその化合物　すべての特定事業場に適用 許容限度は次のとおり

排水量　20㎥/D未満を除く

新設とはS50.8.1以降に設置,既設とはS50.8.1以前に設置されている事業所

BOD,SS,ﾍｷｻﾝ抽出物質(動植)は50㎥/日未満適用除外

クロム、銅、亜鉛、フェノール類、溶解性鉄、溶解性マンガンは20㎥/日未満適用除外

枠内は直罰等による規制に係わる基準値です

資料3

工 事 修 繕 関 係

(1)処理場施設改築計画

(2)水処理施設修繕計画

(3)甲府市浄化センター建設工事台帳

(4)対象施設小規模修繕履歴

(1)処理場施設改築計画

処理場施設改築計画（平成25～29年度）

設　備　名	平成25年	平成26年	平成27年	平成28年	平成29年
水処理施設					
スクリーン設備		●	●		
汚水ポンプ設備	●			●	●
ブロワー設備	●				
曝気沈砂池設備					
最初沈殿池設備			●		
反応タンク設備					
最終沈殿池設備			●	●	
給水砂ろ過設備				●	
塩素滅菌設備					
放流ポンプ設備					
放流ゲート設備					
汚泥処理施設					
濃縮タンク設備					
機械濃縮設備					
汚泥貯留設備					
汚泥脱水機設備					
汚泥焼却設備	●	●	●		
ガス発電設備					
電気設備					
受変電設備					
自家発電設備		●			
監視制御設備				● （住吉ポンプ場）	● （住吉ポンプ場）
本館脱水管理棟		●			

※平成30年年以降の次期処理場改築計画は、平成28年～平成29年に長寿命化計画で策定する。

(2)水処理施設修繕計画

① 水 処 理 施 設 修 繕 計 画

設 備 名	機 器 名	号 機 等	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度
スクリーン設備							
	自動除塵機	粗目除塵機		平成30以降は平成29年度作成予定			
		細目除塵機					
		細目除塵機					
		細目除塵機					
	かす搬出機						
	ホッパー						
	流入ゲート						
	ゲート室ブレーチング						
	フィックスガラス						
	脱臭設備						
汚水ポンプ設備							
	1号ポンプ	NO，1汚水ﾎﾟﾝﾌﾟ					
	2号ポンプ	NO，2汚水ﾎﾟﾝﾌﾟ					
	3号ポンプ	NO，3汚水ﾎﾟﾝﾌﾟ					
	4号ポンプ						
	補器類						
ブロワー設備				平成30以降は平成29年度作成予定			
	1号ブロワー	NO，1曝気ﾌﾞﾛﾜｰ					
	2号ブロワー	NO，2曝気ﾌﾞﾛﾜｰ					
	3号ブロワー	NO，3曝気ﾌﾞﾛﾜｰ					
	ブロワー補機類						
曝気沈砂設備							
第二曝気沈砂設備							
			●				
最初沈殿池				平成30以降は平成29年度作成予定			
	汚泥掻寄機	初沈1－1ｺﾚｸﾀｰ					
		初沈1－2ｺﾚｸﾀｰ					
		初沈2－1ｺﾚｸﾀｰ					
		初沈2－2ｺﾚｸﾀｰ					
		初沈3－1ｺﾚｸﾀｰ					
		初沈3－2ｺﾚｸﾀｰ					
	減速機	初沈1－1ｺﾚｸﾀｰ減速機					
		初沈1－2ｺﾚｸﾀｰ減速機					
		初沈2－1ｺﾚｸﾀｰ減速機					
		初沈2－2ｺﾚｸﾀｰ減速機					
		初沈3－1ｺﾚｸﾀｰ減速機					
		初沈3－2ｺﾚｸﾀｰ減速機	●				
	覆蓋						
	汚泥ﾎﾟﾝﾌﾟ	生汚泥引抜ﾎﾟﾝﾌﾟ					

① 水 処 理 施 設 修 繕 計 画

設 備 名	機 器 名	号 機 等	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度
4系列最初沈殿池				平成30以降は平成29年度作成予定			
			●				
最終沈殿池							
	汚泥掻寄機	終沈1－1ｺﾚｸﾀｰ（上流）					
		終沈1－1ｺﾚｸﾀｰ（下流）					
		終沈1－2ｺﾚｸﾀｰ（上流）					
		終沈1－2ｺﾚｸﾀｰ（下流）					
		終沈2－1ｺﾚｸﾀｰ（上流）					
		終沈2－1ｺﾚｸﾀｰ（下流）					
		終沈2－2ｺﾚｸﾀｰ（上流）					
		終沈2－2ｺﾚｸﾀｰ（下流）					
		終沈3－1ｺﾚｸﾀｰ（上流）					
		終沈3－1ｺﾚｸﾀｰ（下流）					
		終沈3－2ｺﾚｸﾀｰ（上流）					
		終沈3－2ｺﾚｸﾀｰ（下流）					
	減速機	終沈1－1ｺﾚｸﾀｰ減速機					
		終沈1－2ｺﾚｸﾀｰ減速機					
		終沈2－1ｺﾚｸﾀｰ減速機					
		終沈2－2ｺﾚｸﾀｰ減速機					
		終沈3－1ｺﾚｸﾀｰ減速機					
		終沈3－2ｺﾚｸﾀｰ減速機	●				
	汚泥返送ﾎﾟﾝﾌﾟ	1系汚泥返送ﾎﾟﾝﾌﾟ（3台）					
		2系汚泥返送ﾎﾟﾝﾌﾟ（3台）					
		3系汚泥返送ﾎﾟﾝﾌﾟ（2台）					
	余剰ﾎﾟﾝﾌﾟ	余剰引抜ﾎﾟﾝﾌﾟ					
4系列最終沈殿池				平成30以降は平成29年度作成予定			
			●				
反応タンク							
	池関係覆蓋						
	エアー配管バルブ						
4系列反応タンク							
砂ろ過設備							
	No.1,2砂ろ過塔	砂ろ過塔					
	No.3砂ろ過塔						
	ハロン						
消毒設備							
	塩素注入設備	塩素滅菌施設					
	塩素混和池	塩素混和池壁面					
	除外装置	漏洩検知器					
	ゲート						
放流ゲート							
	No1放流ゲート						
	No2放流ゲート						
	最終放流ゲート		●				

①　水　処　理　施　設　修　繕　計　画

設　備　名	機　器　名	号　機　等	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度
高圧受変電設備				平成30以降は平成29年度作成予定			
自家用発電設備		自家用発電設備					
NAS電池設備							
直流電源装置							
	蓄電池盤						
	充電器盤						
	インバーター盤						
中央監視制御設備							
管理棟							
	防水	ポンプ棟・曝沈棟他建物上屋防水					
	給排水設備	暖房用ﾎﾞｲﾗｰ					
	空調換気設備	中央監視室空調					
		本館冷房用冷凍機					
	昇降機	本館ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ					
	その他		●				
	防災設備	本館消防用設備					

② 汚 泥 処 理 施 設 修 繕 計 画

（単位：千円

設 備 名	機 器 名	号 機 等	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度
濃 縮 設 備				平成30以降は平成29年度作成予定			
機械濃縮設備							
汚泥貯留設備							
汚 泥 ピット 設 備							
脱 水 設 備							
	汚泥供給ポンプ			平成30以降は平成29年度作成予定			
		NO，3汚泥供給ﾎﾟﾝﾌﾟ					
		NO，4汚泥供給ﾎﾟﾝﾌﾟ					
		NO，5汚泥供給ﾎﾟﾝﾌﾟ					
		NO，6汚泥供給ﾎﾟﾝﾌﾟ					
	薬注ポンプ	NO，3薬液供給ﾎﾟﾝﾌﾟ					
		NO，4薬液供給ﾎﾟﾝﾌﾟ					
		NO，5薬液供給ﾎﾟﾝﾌﾟ					
		NO，6薬液供給ﾎﾟﾝﾌﾟ					
	脱 水 機	NO，3脱水機（ﾍﾞﾙﾄﾌﾟﾚｽ）					
		NO，4脱水機（ﾍﾞﾙﾄﾌﾟﾚｽ）					
		NO，5脱水機（遠心）					
		NO，6脱水機					
	ｹｰｷ搬送	ｺﾝﾍﾞｱ					
		圧送ポンプ					
	ポ ン プ	ろ布洗浄ﾎﾟﾝﾌﾟ					
		高架水槽揚水ﾎﾟﾝﾌﾟ					
	空 気 源 装 置						
脱 水 機 棟							
	空調換気設備	中央監視室空調					
	ハロン						
焼 却 設 備							

③ 住 吉 ポ ン プ 場 修 繕 計 画

設 備 名	機 器 名	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度
低段沈砂池設備			平成30以降は平成29年度作成予定			
	流入ゲート					
	自動除塵機					
低段ポンプ設備						
	排水ポンプ					
	計装					
高段沈砂池設備						
	流入ゲート					
	沈砂掻揚機					
	自動除塵機					
	搬出機					
高段ポンプ設備						
	排水ポンプ					
	計装					
汚水簡易処理設備						
	汚泥掻寄機					
	給水ポンプ					
	排水ポンプ					
次亜塩注入設備						
	次亜注入ポンプ					
	溶液タンク					
高圧受変電設備						
	高圧受変電盤					
	無停電電源設備					
	周波数変換装置					
自家用発電設備						
中央監視制御設備						
	監視制御装置					
	シーケンサ装置					
	遠方監視装置					
管理棟	空調換気設備					

④ 雨 水 ポ ン プ 場 修 繕 計 画

設　備　名	機 器 名	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度
雨水沈砂池設備			平成30以降は平成29年度作成予定			
	流入ゲート					
	自動除塵機					
雨水ポンプ設備						
	排水ポンプ					
高圧受変電設備						
	高圧受変電盤					
自家用発電設備						

池 添 ポ ン プ 場 修 繕 計 画

設　備　名	機 器 名	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度
沈砂池設備			平成30以降は平成29年度作成予定			
	流入ゲート					
	自動除塵機	●				
ポンプ設備						
	排水ポンプ					
高圧受変電設備						
	高圧受変電盤					
	監視制御装置					
	遠方監視装置					
	直流電源装置更新					
自家用発電設備						

(3)甲府市浄化センター建設工事台帳

甲府市浄化センター建設工事台帳

管理本館

年 度	工　　事　　名	請 負 業 者	工　　期	工　　事　　概　　要
S.50	ブロワー棟、管理本館築造工事（第一期）	名工建設（株）		ブロワー棟RC地下1階877m2、管理本館RC地下1階1,483m2
〃	管理本館鉄骨工事	〃		管理本館1～R階鉄骨建方
S.51	〃　建設工事（第二期）	〃		鉄骨鉄筋コンクリート造,地下1～R階3,806m2
〃	〃　外構工事	〃		石段及び池築造工,北東,南西,正面106m
〃	〃　内装工事	〃		天井、受水槽内部,受水槽マンホール
〃	〃　設備工事（その1）	日立プラント建設		空気調和、換気設備
〃	〃　設備工事（その2）	（株）山梨工業社		給排水衛生設備
S.52	〃　仕上げ工事	名工建設（株）		防水、タイル、建具、ガラス、塗装他
〃	〃　仕上げ工事（その2）	〃		受電設備に伴うシンダーコン打設、内外装仕上げ
〃	〃　給水工事	宮本水工		上水引き込み
〃	〃　設備工事（その1の2）	日立プラント建設		空気調和設備
〃	〃　設備工事（その2の2）	（株）山梨工業社		給排水衛生設備
〃	受変電設備工事	三菱電機（株）		管理本館高圧引込、変圧器盤他、幹線設備
S.53	水道加入負担金	水道局		
S.54	自家用発電機設備工事	（株）明電舎	S54.7.13～S55.3.25	2000KVA　1600KW　2400PS　1基
〃	自家発電機用重油タンクピット基礎工事	（株）若林建設	S54.12.25～S55.3.25	重油タンクピット、冷却水ピット
〃	管理本館建築施設水質設備工事	豊前医化（株）	S55.2.1～S55.3.25	実験台、作業台、ﾄﾞﾗﾌﾄﾁｬﾝﾊﾞｰ、ｸﾘｰﾝﾍﾞﾝﾁ、戸棚
〃	〃　〃　（その2の1）	〃	S55.3.6～S55.3.25	
〃	〃　〃　（その2の2）	（有）ロイヤル商事	S55.3.6～S55.3.25	電気炉、純水製造装置、シアン蒸留装置、自動採水器
〃	〃　〃　（その2の3）	豊前医化（株）	S55.3.6～S55.3.25	
〃	〃　〃　（その2の4）	三枝理研	S55.3.6～S55.3.25	熱分解装置、乾熱滅菌器、原子吸光光度計、ガス配管他
〃	管理本館バルコニー手摺補修工事	名工建設（株）	S54.10.11～S54.10.30	強化ガラス　1.1×2.015m　ステンレス枠、リブ取付
S.60	焼却炉設置工事	広瀬煉瓦工業所	S61.2.13～S61.3.18	火格子面積　1.137m2、最大焼却量　1,800kg/日（8時間）
H.11	管理本館屋上防水及び外壁改修工事	（株）村松工務所	H.11.11.18～H.12.3.30	屋上塗膜防水、外壁改修
H19	直流電源装置更新工事	（株）エヌディエス	2007/10/3～H20.3.18	無停電電源装置（管理本館）　一式　　直流電源装置（脱水機棟）　　撤去工事　一式
H20	監視制御設備更新工事	横河電気（株）環境システム営業本部	H20.8.25～H21.10.30	甲府市浄化センター重力濃縮槽改築工事
H22	甲府市浄化センター管理本館空調設備他更新（機械設備）工事	大栄設備㈱	H22.9.21～H.23.3.11	空調設備更新工事一式、便所改修工事一式、給排水衛生設備工事一式 便所改修工事一式
〃	甲府市浄化センター管理本館空調設備他更新（電気設備）工事	㈱宝和興業	H22.10.7～H23.3.11	動力幹線、動力、電灯幹線、電灯コンセント、電話、拡声、電気時計、自火報工事
〃	甲府市浄化センター受変電設備更新工事　その1	㈱明電舎	H22.9.24～H24.3.9	受変電設備　1式、撤去工事　1式
〃	甲府市浄化センター受変電設備更新工事　その2	横河電機㈱環境システム営業本部	H22.12.20～H24.3.9	運転操作設備　1式、監視制御設備　1式、移設設備　1式
H23	甲府市浄化センター管理本館消火設備改修工事	セントラル防災㈱	H23.9.22～H24.1.19	ハロン貯蔵容器設備　1式、ハロン消火設備　1式
H26	甲府市浄化センター自家発電機盤更新工事	㈱明電舎	H26.8.14～H27.3.2	自動始動盤1面、発電機盤1面、母線連絡盤1面、既設盤撤去6面
	計			

《水処理施設》

主ポンプ施設

年 度	工　　事　　名	請 負 業 者	工　　期	工　　事　　概　　要
S.49	ポンプ所建設工事(第1期)	(株)間　組		
S.50	ポンプ所築造工事(第1期)	〃		コンクリート工事　597m3、鉄筋工事　78.5t
〃	〃　　(第2期)	〃		躯体工事、換気、給排水衛生設備工事
〃	ポンプ棟付属水路築造工事	〃		RC造、1.9×1.9　24.3m、2.15×2.0　11.2m、2.55×2.2　12.8m
S.53	スクリーン機械設備工事	荏原ｲﾝﾌｨﾙｺ(株)		粗目、細目スクリーン、掻揚機、搬出機等
〃	主ポンプ機械設備工事	久保田鉄工(株)		主ポンプ(84m3/分)2台、天井走行クレーン他
S.54	建設施設床仕上工事(その1・その2)	名工建設(株)	S54.6.28～S55.3.25	ポンプ棟、ブロワー棟、曝沈、初沈の各電気室、発電機室の シンダーコン及び仕上げ
S.55	ポンプ棟吐出水路防水工事	(株)間　組	S55.5.13～S55.8.10	ポンプ棟　305m2
〃	ポンプ棟給水配管設備工事	(有)宮本水工	S56.2.4～S56.3.5	給水管埋設工事
H.4	汚水ポンプ設備増設工事(機械設備)	(株)クボタ	H4.7.17～H5.3.18	主ポンプ(70m3/分)1基
〃	ポンプ増設電気設備工事	富士電機(株)	H4.7.17～H5.2.28	(放流ポンプ電気設備を含む)(重複掲載)
H.16	No.4汚水ポンプ設置(機械設備)工事	アタカ工業㈱東京本社		主ポンプ(70m3/分)1基
〃	〃　　(電気設備)工事	㈱ふじでん		〃
〃	No.2スクリーン設備設置(機械設備)工事	神電業社機械製作所　静岡支店		細目スクリーン　自動除塵機　目幅25mm
〃	〃　　(電気設備)工事	小山電機工業㈱		〃
H19	計装設備更新工事	(株)望月電気	H20.1.21～H20.3.18	流入渠、ポンプ井
H25	スクリーンポンプ棟耐震補強に伴うアスベスト除去工事	大田工業㈱	H25.7.5～H25.12.10	天井及び壁面石綿含有吹付材除去1087㎡、下地処理の上ロックウール吹付1004㎡
〃	汚水ポンプ、ブロワー電動機盤更新工事「高率」	メタウオーター㈱	H25.8.23～H26.5.19	電動機盤(VMC)5面、ブロワー用断路器盤機能増設
〃	汚水ポンプ、ブロワー電動機盤更新工事「低率」	メタウオーター㈱	H25.8.23～H26.5.19	電動機盤(VMC)5面、ブロワー用断路器盤機能増設
〃	スクリーンポンプ棟FIX窓改修工事	藤沢鉄工㈱	H25.10.11～H26.1.20	鉄骨工事1式、屋根・外壁(ALC)工事1式、防水工事1式
H26	スクリーンポンプ棟耐震補強工事	道拓建設㈱	H26.6.11～H27.2.17	スクリーンポンプ棟内部耐震壁増設　1式
〃	スクリーンかす設備更新(機械設備)工事	水ing㈱	H26.7.18～H2711.26	搬出機3台、ホッパ1基、脱臭装置1基、流入ゲート4門、自動除塵機2基
〃	スクリーンかす設備更新(電気設備)工事	メタウオーター㈱	H26.8.4～H27.11.30	運転操作設備1式、配線配管その他工事1式、既設撤去工事1式
〃	スクリーンかす設備更新(機能増設)工事	横河ｿﾘｭｰｼｮﾝｻｰﾋﾞｽ㈱	H26.11.12～H27.11.30	中央監視制御設備機能増設1式
	計			

ブロワー施設

年 度	工　　事　　名	請 負 業 者	工　　期	工　　事　　概　　要
S.51	ブロワー棟築造工事	(株)日本軽石		地下部分は管理棟に含む。RC造1・2階　711.1m2
S.53	曝気用ブロワー機械設備工事	三菱重工業(株)		ブロワー(170m3/分)2台、強制給油装置、天井クレーン他
S.54	ブロワー棟防災施設工事	名工建設(株)	S55.2.12～S55.3.29	ｵｲﾙﾍｯﾄﾞﾀﾝｸ室　9m2、ﾊﾛｹﾞﾝ消火設備、大型消火設備
S.56	曝気用ブロワー設備工事(増設)	三菱重工業(株)	S56.6.29～S57.1.26	ブロワー(170m3/分)1台
〃	池電気棟受変電、ブロワー電気設備工事	富士電機製造(株)	S56.6.29～S57.1.26	池電気棟受変電設備工事を含む(重複掲載)
H.24	ブロワ棟ハロンガス消火設備他更新工事(長寿命化)	セントラル防災㈱	H25.1.21～H25.5.20	・ブロワ棟ハロゲン化物消火設備一式・脱水機棟屋内消火栓設備一式
H25	汚水ポンプ、ブロワー電動機盤更新工事「高率」	メタウオーター㈱	H25.8.23～H26.5.19	電動機盤(VMC)5面、ブロワー用断路器盤機能増設
〃	汚水ポンプ、ブロワー電動機盤更新工事「低率」	メタウオーター㈱	H25.8.23～H26.5.19	電動機盤(VMC)5面、ブロワー用断路器盤機能増設
	計			

曝気沈砂池施設

年 度	工　　事　　名	請 負 業 者	工　　期	工　　事　　概　　要
	〈第一曝気沈砂池施設〉			
S.52	曝気沈砂池建設工事	(株)間　組		地下部
S.53	〃　　〃	〃		RC造、地下1階.地上2階　870m2、 水路　447m2
S.54	曝気沈砂池機械設備工事	荏原ｲﾝﾌｨﾙｺ(株)	S54. 9.18～S55. 3.25	分水ゲート、沈砂掻揚機、搬出機、沈砂ホッパ、脱臭装置他
〃	曝気沈砂池棟床仕上げ工事	名工建設(株)	S55. 2.12～S55. 3.25	脱臭機室機械基礎、シンダーコン打設、床仕上げ
S.56	曝気沈砂池設備工事(増設)	荏原ｲﾝﾌｨﾙｺ(株)	S56. 6.29～S56.12. 5	沈砂掻揚機2基、散気装置　6基
〃	曝気沈砂池電気設備工事	富士電機製造(株)	S56. 6.29～S57. 1.26	(放流ポンプ電気設備を含む)(重複掲載)
H19	曝気沈砂池設備更新機械設備工事	(株)前澤工業東京支店	H20.3.19～H21.3.13	掻揚機、搬出機、ホッパー、脱臭撤去・ジェット、生物脱臭設置
H20	曝気沈砂池設備更新(電気設備)工事	(株)ふじでん	H20.5.21～H21.3.13	上記に伴う電気工事
〃	曝気沈砂池設備電気設備工事	城南電気(株)	H20.4.24～H20.10.31	既設電気設備撤去
	小　　計			
	〈第二曝気沈砂池施設〉			
H.11	第二曝気沈砂池築造工事(土木)	早川工業、 地建工業JV	H11. 7. 5～H12. 3.30	分配槽、連絡管廊、曝気沈砂池、特高連絡管廊、初沈流入水路
〃	〃　〃　(機械)	前澤工業(株)	H12. 2.28～H13. 3.10	沈砂池設備、スカム分離設備、脱臭設備
〃	〃　〃　(電気)	富士電機(株)	H12. 2.28～H13. 3.10	運転制御設備、計装設備
〃	〃　〃　(建築)	(株)早野組	H12. 3.27～H12.10.31	591.55m2
H.12	〃　〃　(建築付帯機械)	(株)ｻｲｴﾝｽ設備	H12. 3.27～H12.10.31	空気調和設備、給排水衛生設備
〃	〃　〃　(建築付帯電気)	(株)アスロック	H12. 3.27～H12.10.31	電灯、動力、電話、拡声、火災報知設備
	小　　計			
	計			

水処理施設

年 度	工　　事　　名	請 負 業 者	工　　期	工　　事　　概　　要
	〈第一系列〉			
S.48	最初、最終沈殿池、ｴｱﾚｰｼｮﾝﾀﾝｸ築造工事	(株)間　組		
S.49	沈殿池築造工事	〃		確認(内容不明)
〃	〃　　〃	〃		確認(内容不明)
S.51	ゲート設置工事	(株)森田鉄工所		鋳鉄製角型　1,000×1,000　3門
S.53	最初沈殿池機械設備工事	久保田鉄工(株)		ｹﾞｰﾄ、メイン、クロスコレクター、汚泥ポンプ他
〃	エアレーションタンク機械設備工事	(株)新潟鉄工所		ゲート　2門、可動堰　4門、散気装置80基、吊上げ機　1基
〃	最終沈殿池機械設備工事	住友重機械工業(株)		ｹﾞｰﾄ、メイン、クロスコレクター、汚泥ポンプ他
S.54	水処理動力電気設備工事	富士電機製造(株)	S54.7.13～S55.3.25	水処理施設動力盤、現場操作盤、配線工事
〃	水処理監視計装設備工事	(株)横河電機製作所	S54.7.13～S55.3.25	中央監視パネル、操作卓、遠制盤他
〃	最初沈殿池等水張工事	早川工業(株)	S54.7.11～S54.8.29	水張工　21,300m2
〃	最初沈殿池覆蓋工事	三菱樹脂(株)	S55.2.27～S55.3.25	FRP 1,020m2
S.55	エアレーションタンク覆蓋工事	〃	S55.7.12～S56.1.10	FRP 2,562m3
H.12	浄化センター内ゲート改修工事	(株)早野組	H12.12.28～H13.2.26	バイパスゲート撤去及び開口部拡大
H.16	最初沈殿池生汚泥ポンプ取替工事	(有)新光設備工業		生汚泥ポンプ　2台　池排水ポンプ　1台
H.19	反応タンク(第1系列)改修工事	(株)米山実業		ライザー管・散気筒取替
H.22	水処理第一系列最初沈殿池他更新工事	荏原エンジニアリングサービス㈱横浜支店	H23.3.17～H24.2.24	最初沈殿池設備他　1式
H.24	最終沈殿池(1－2)汚泥掻寄減速機改修工事(長寿命化)	住重環境ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱	H24.10.1～H25.2.20	(1－2)上流用、クロス用、下流用減速機及びスプロケット類　各1台
	小　　計			
	〈第二系列〉			
S.55	最初、ｴｱﾚｰｼｮﾝﾀﾝｸ及び最終沈殿池の一部築造工事	(株)間　組	S55.7.12～S56.3.25	(最初、最終沈殿池、ｴｱﾚｰｼｮﾝﾀﾝｸ)基礎
〃	最初沈殿池築造工事	〃	S55.12.26～S56.3.25	コンクリート　2,200m3、型枠　8,667m2、　鉄筋
S.56	最終沈殿池の一部増築工事	〃	S56.5.28～S56.8.5	コンクリート　526m3、型枠　871m2
〃	最初沈殿池、エアレーションタンク覆蓋工事	三菱樹脂(株)	S56.6.2～S56.10.29	
〃	水処理施設電気棟築造工事	(株)深沢工務所	S56.5.28～S56.10.24	RC造　241.9m2
〃	池電気棟受変電設備工事	富士電機製造(株)		ブロワー電気設備工事を含む(重複掲載)
〃	最初沈殿池設備工事	荏原ｲﾝﾌｨﾙｺ(株)	S56.7.13～S57.2.7	ﾒｲﾝ、ｸﾛｽｺﾚｸﾀｰ、ｽｶﾑｽｷﾏｰ、ｹﾞｰﾄ他
〃	エアレーションタンク設備工事	日本鋼管(株)	S56.7.13～S57.2.7	ｹﾞｰﾄ、可動堰、散気装置
〃	最終沈殿池設備工事	荏原ｲﾝﾌｨﾙｺ(株)	S56.7.13～S57.2.7	ﾒｲﾝ、ｸﾛｽｺﾚｸﾀｰ、ｽｶﾑｽｷﾏｰ、ｹﾞｰﾄ他
H.19	反応タンク改修工事	(株)丸真冷熱	H19.7.2～H19.11.30	ライザー管、消泡水配管、散気筒取替

年 度	工　　事　　名	請 負 業 者	工　　期	工　　事　　概　　要
	〈第二系列〉			
S.57	最終沈殿池手摺工事	(株)間　組		スパン　2m、H＝1,100、L＝323m、コーナー　28箇所
〃	水処理動力電気設備工事	富士電機製造(株)	S57. 7.12～S58. 1. 7	水処理動力電気設備　1式
〃	水処理計装電気設備工事	(株)横河電機製作所	S57. 7. 5～S57.12.31	水処理計装電気設備　1式
〃	池照明設備工事(エアタン)	高野電工		
〃	水処理計装実装工事	(株)横河電機製作所	S57. 7.31～S57.12.27	中央監視室計装設備実装工　1式
〃	水処理電気棟防虫網取付工事	藤本板金工業所		防虫網　12箇所
S.58	池水路角落し工事	(有)管清社	S58. 7. 7～S58. 8. 5	角落し工　24箇所、鉄蓋設置　4箇所、仮壁壊し　5箇所
〃	計装設備改装工事	横河北辰電機(株)	S58.11. 5～S59. 1.31	計装設備改装工　1式
〃	エアレーションタンク手摺設置工事	(有)貢川鉄工所	S60. 8. 8～S60. 9. 6	ネットフェンス1.2H　190.1m
S.60	返送ポンプ回転数制御装置設置工事	(有)篠原製作所	S60.10.29～S61. 1.26	第1～2系列分　回転数制御装置　2面、中央調節制御系　2系
H.24	最初沈殿池(2－3)流入ゲート改修工事(長寿命化)	水ing㈱横浜支店	H24.10.1～H25.3.6	最初沈殿池(2－3)流入ゲート　1門
〃	最初沈殿池(2－1)他流入ゲート改修工事(長寿命化)	水ing㈱横浜支店	H25.1.9～H25.7.29	最初沈殿池(2－1)他流入ゲート　5門
H26	最終沈殿池(2-1)コレクター減速機取替工事	水ing㈱横浜支店	H27.11.9～H28.3.18	駆動スプロケット(上流)1個、(クロス)1個、(下流)1個、減速機(上流)1個、(クロス)1個
H28	最終沈殿池第2系列越流堰更新工事	水ing㈱横浜支店	H28.7.15～H29.7.15	越流堰銅版2t×250H503m、越板トラフ銅版0.35t984㎡
	小　　計			
	〈第三系列〉			
S.58	池水路角落し工事	(有)管清社		角落し工　5箇所
H. 1	水処理第三系列築造工事	間組、早川工業、 吉沢建設JV	H 1. 9.25～H 2.10.31	初沈、エアタン、終沈
〃	〃　〃　(管廊機械設備)工事	花輪工業所	H 1.10.19～H 2. 7.31	返送汚泥ポンプ2台、鋳鉄管弁類　1式
〃	水処理施設第三系列に伴う附帯工事 (第一系列最終沈殿地電気設備移設)	富士電機(株)	H 1.10.19～H 2. 3.18	第一系列最終沈殿池コントロールセンター盤移設
〃	水処理第三系列築造工事に伴う附帯工事	間組、早川工業、 吉沢建設JV	H 2. 2. 8～H 2. 3.18	仮設桟橋　1式
H. 2	〃　〃　機械設備工事(沈殿池)	住友重機械工業(株)	H 2. 7. 7～H 3. 3.18	ﾒｲﾝ、ｸﾛｽｺﾚｸﾀｰ、ｽｶﾑｽｷﾏｰ、ｹﾞｰﾄ他
〃	〃　〃　機械設備工事(ｴｱﾚｰｼｮﾝ)	栗田工業(株)	H 2. 7. 7～H 3. 3.19	ｹﾞｰﾄ、可動堰、散気装置(88基)、空気流量計　4基
〃	〃　〃　電気設備工事	富士電機(株)	H 2. 7. 7～H 3. 3.20	運転操作、計装設備　1式
〃	水処理施設第三系列に伴う附帯工事 (第一系列最初沈殿地電気設備移設)	〃	H 2.10.15～H 3. 3.18	第一系列最初沈殿池ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ盤等の池上電気室移設
H. 3	第三系列稼動に伴う流入水路仮壁撤去工事	吉沢建設(株)	H 3. 4.19～H 3. 5. 6	仮壁撤去　4箇所
〃	〃　〃　改良工事	横河電機(株)	H 3.11.14～H 4. 3.18	初沈流入量計改良　1式、バイパス水路流量計　1式
H17	甲府市浄化センター反応タンク改修工事	㈱米山実業		散気筒取替
H27	最初沈殿池汚泥掻寄機(No.6-2)長寿命化工事	㈱メイキョー	H27.8.27～H28.2.22	(No.6-2)サイクロ減速機1台、駆動チェーン、スプロケット1式
	小　　計			

年 度	工　　事　　名	請 負 業 者	工　　期	工　　事　　概　　要
	〈第四系列〉			
H.11	水処理第四系列築造工事(土木)	早野組、長田組土木、 三枝組JV	H11. 7. 5～H12.10.16	初沈、反応槽、終沈、水処理電気室
H.12	水処理第四系列築造工事(建築付帯設備)	甲陽電気(株)	H12. 7.21～H13. 3.21	電灯、動力、電話、拡声、火報、照明、空調、給排水設備
〃	水処理第四系列築造工事(第1期機械)	(株)神戸製鋼所	H12.11. 6～H13.12. 2	1/2系列の初沈、反応槽、終沈、機械設備
〃	水処理第四系列築造工事(第1期電気)	(株)明電舎	H12.10. 6～H13.12. 2	1/2系列の初沈、反応槽、終沈、運転制御、計装設備
H21	水処理第四系列増設工事(第2期機械設備)	荏原エンジニアリングサービス	H21.10.22～H22.10. 29	1/2系列の初沈、反応槽、終沈、機械設備
〃	水処理第四系列増設工事(第2期電気設備)	横河電気(株)環境システム営業本部	H21.1.12～H22.10.29	1/2系列の初沈、反応槽、終沈、運転制御、計装設備
	小　　計			
	計			

管　廊

年 度	工　　事　　名	請 負 業 者	工　　期	工　　事　　概　　要
S.49	管廊工事	(株)間　組		
S.50	〃　(第二期)	〃		内法　5×4.85m　36.0m　(前年度より繰延べ分)
S.54	管廊内電気設備工事	山工電気(株)	S55. 2.13～S55. 3.25	照明、動力、弱電、自火報、配線工事他
〃	水処理施設管廊内配管設備工事	住友重機械工業(株)	S54. 7.13～S55. 2.10	空気、汚泥、処理水配管他
〃	汚泥処理施設管廊内配管設備工事	(有)司水道	S54. 6.28～S54.12. 4	余剰汚泥管、生汚泥移送管、消化汚泥引抜管他
S.55	管廊内電気設備工事	甲陽電気(株)	S56. 1.28～S56. 2. 6	照明
S.57	水処理第二系列管廊内電気設備工事	(有)河西電業社	S56. 7. 5～S56. 9. 8	照明、動力、拡声、電話、配線工事他
H21	管廊耐震対策工事	(株)森山組	H21.12.24～H22.3.8	後付式可とう継手設置L＝105m
H22	管廊耐震対策(H22)工事	小沢建設㈱	H22.12.1～H23.3.9	後付式ゴム伸縮可とう継手設置　L=112m
H23	甲府市浄化センター管廊耐震対策(H23)工事	地建工業㈱	H24. 2.13～H24.7.11	後付式ゴム伸縮可とう継手設置　L=111m
H24	甲府市浄化センター管廊耐震対策(H24)工事	小沢建設㈱	H24.10.17～H25.2.28	後付式ゴム伸縮可とう継手設置　L=192m
	計			

砂濾過施設

年 度	工　　事　　名	請 負 業 者	工　　期	工　　事　　概　　要
S.52	処理水ポンプ棟建設工事	長田組土木(株)		RC造、地下1階、地上2階　1,553.9m2
〃	〃　〃　建築付帯設備工事	山興設備(株)		空気調和、給排水衛生設備
〃	〃　〃　建築付帯電気工事	鶴田電気(株)		照明、動力、弱電、自火報他
S.54	建築施設床仕上工事(その3)	長田組土木(株)	S54. 6.28～S55. 3.25	処理水ポンプ棟、塩素滅菌機棟の機器設置床及び仕上
〃	砂濾過タンク、余剰ガス燃焼装置基礎工事	加賀美建設(株)	S54. 9. 3～S55. 1.10	砂濾過タンク、余剰ガス燃焼装置基礎
〃	給水砂濾過設備工事	水道機工(株)	S54. 7.13～S55. 2.10	砂濾過塔、給水ポンプ、ストレーナ他
H.3	給水砂濾過設備増設工事(機械設備)	荏原ｲﾝﾌｨﾙｺ(株)	H 3. 9.20～H 4. 2.28	砂濾過塔(4,400m3/日)1基、給水ポンプ　2台、圧縮機　2台、次亜塩注入設備
〃	〃　〃　(電気設備)	横河電機(株)	H 3. 9.17～H 4. 3.18	運転操作設備
H.24	処理水ポンプ棟揚水ポンプ改修工事(長寿命化)	小山電機工業㈱	H24.11.26～H25.3.6	脱水機棟高架水槽用揚水ポンプ　2台
H26	処理水ポンプ棟床排水ポンプ現場操作盤更新工事	佐々木電気	H26.10.27～H27.2.23	現場操作盤1面
H27	処理水ポンプ棟励突抑制開閉器設置工事	メタウオーター㈱	H27.8.26～H28.1.8	励突抑制開閉器1台、変圧器盤機能増設1式、変圧器一次盤機能増設1式
H28	処理水ろ過設備更新工事	住友重機械エンバイロメント㈱	H28.7.4～H29.3.17	№1ろ過装置　処理水量4,000㎥／日、3系処理水取水ポンプ　着脱式2台
	計			

塩素滅菌施設

年 度	工　　事　　名	請 負 業 者	工　　期	工　　事　　概　　要
S.51	塩素滅菌施設工事(第一期)	(株)間　組		混和池　2池、放流ポンプ井　1池、流入・吐出・分岐水路
〃	〃　〃　(第二期)	〃		放流ポンプ棟　239.7m2、塩素滅菌棟　300.4m2
S.52	〃　〃　(第三期)	〃		外壁吹付、外階段仕上、スロープ新設
S.53	塩素混和池流入水路及び管廊築造工事	(株)島津組		ﾎﾞｯｸｽ(管廊2.45～3.9×5　16.7m)(水路1.7×2.5　41.5m)
〃	塩素滅菌機械設備工事	磯村豊水機(株)		流入ｹﾞｰﾄ2基、滅菌機2基、気化器2台、ﾎﾟﾝﾍﾟ4本、中和塔他
H.23	塩素滅菌設備更新工事	磯村豊水機工㈱	H23. 8.31～H24. 2.16	貯留タンク　2槽、注入ポンプ　2台、電気工事　1式
〃	甲府市浄化センター塩素滅菌設備更新(機能増設)工事	横河電機㈱環境システム営業本部	H23.12.14～H24. 2.16	塩素滅菌室RI/O-L盤機能増設、ｺﾝﾄﾛｰﾗ(K-CONT-7)機能増設　他
	計			

放流ポンプ施設

年 度	工　　事　　名	請 負 業 者	工　　期	工　　事　　概　　要
S.55	放流ポンプ設備工事	(株)日立製作所	S55. 6.26～S56. 1.31	放流ポンプ(800φ)1台、真空ポンプ
〃	〃　〃　電気設備工事	富士電機製造(株)	S55. 6.26～S56. 2.10	配電盤、現地盤
S.56	放流ポンプ設備工事(増設)	(株)日立製作所	S56. 6.29～S57. 1.26	放流ポンプ(800φ)1台、真空ポンプ
〃	〃　〃　電気設備工事(増設)	富士電機製造(株)		曝沈電気設備を含む(重複掲載)
H. 4	放流ポンプ設備増設工事(機械設備)	(株)日立製作所	H 4. 7.17～H 5. 2.28	放流ポンプ1台
〃	ポンプ増設電気設備工事	富士電機(株)	H 4. 7.17～H 5. 3.18	汚水ポンプを含む(重複掲載)
H17	自家発電設備増設工事	富士電機システムズ㈱		NAS電池、受配電盤設置
	計			

放流施設

年 度	工　　事　　名	請 負 業 者	工　　期	工　　事　　概　　要
S.52	放流渠築造工事(伏越部)	(株)間　組		流川伏越部、ボックスカルバート　1.8×1.8　38.1m
S.53	放流渠機械設備工事	飯田鉄工(株)		放流ゲート(1.6W×1.8H)4門
	計			

《汚泥処理施設》

汚泥濃縮･消化施設

年 度	工 事 名	請 負 業 者	工 期	工 事 概 要
S.53	消化タンク建設工事	(株)間 組		φ23m×13.5m(水深)×2槽
〃	濃縮タンク建設工事	〃		φ16m× 3m(水深)×2池
S.54	消化タンク建設付帯工事	〃	S54.6.22～S54.9.19	足場金物、手摺、防水、防蝕塗装他
〃	濃縮、消化タンク設備工事	住友重機械工業(株)	S54.7.13～S55.3.10	掻寄機、ｶﾞｽﾀﾝｸ、脱硫塔、加温ﾎﾞｲﾗｰ、ﾌﾞﾛﾜｰ他
〃	脱硫塔、ﾎﾞｲﾗｰ重油ｽﾄﾚｰｼﾞﾀﾝｸ基礎工事	大新工業(株)	S54.9.3～S55.1.10	脱硫塔、ｽﾄﾚｰｼﾞﾀﾝｸ基礎
〃	ガスタンク、ケーキホッパー基礎工事	境三枝建設(株)	S54.9.3～S55.1.10	ガスタンク、ケーキホッパー基礎
〃	ガス配管基礎工事	大勝組土木	S54.9.3～S55.1.10	ガス配管基礎
S.55	汚泥処理計装、消化ﾀﾝｸ動力電気設備工事	富士電機製造(株)	S54.7.12～S55.2.28	脱水機、濃縮、消化タンク計装盤、動力盤他
〃	汚泥処理計装ケーブル工事	〃 〃	S56.2.4～S56.2.28	計装ケーブル工事
H.18	甲府市浄化センター汚泥濃縮設備増設(電気設備)	日新電機㈱東京支社	H18.8.28～H19.3.16	機械(ベルト)濃縮機 50㎥/h 2台
〃	甲府市浄化センター汚泥濃縮設備増設(機械設備)	三機工業	H18.9.7～H19.3.16	〃
H20	重力濃縮槽改築工事	住友重機械エンバイロメント(株)	H20.8.25～H21.3.13	No.2掻寄機、覆蓋更新、槽内防食塗装
H21	No.1重力濃縮槽改築(機械設備)工事	住友重機械エンバイロメント(株)	H21.8.6～H22.3.8	No.1掻寄機取替、槽内防食塗装
H22	重力濃縮槽改築(電気設備)工事	横河電機㈱	H22.7.5～H23.3.11	CCR盤･現場操作盤･制御線更新
H23	甲府市浄化センター濃縮タンク脱臭設備更新工事	水ing㈱横浜支店	H23.12.28～H24.10.22	生物脱臭装置(処理風量30㎥/分) 1基
H24	甲府市浄化センター濃縮タンク脱臭設備更新(機能増設)工事	横河電機㈱	H24.6.11～H24.10.22	濃縮槽設備補助継電器盤機能増設 1式
	計			

汚泥貯留施設

年 度	工 事 名	請 負 業 者	工 期	工 事 概 要
S.58	汚泥貯留槽築造工事	進藤建設(株)	S58.6.20～S58.11.16	土木、建築、電気設備
〃	〃 〃 機械設備工事	日立ﾌﾟﾗﾝﾄ建設(株)	S58.6.20～S59.1.31	汚泥貯留槽機械設備
〃	〃 〃 電気設備工事	富士電機製造(株)	S58.6.20～S59.1.31	動力、計装設備
H.4	〃 〃 築造工事(土木)	早川工業(株)	H4.10.2～H5.3.18	汚泥貯留槽 1基、管廊施設 1式
〃	〃 〃 増設機械設備工事	住友重機械工業	H4.9.28～H5.3.18	空気撹拌装置 1式、活性炭吸着等 1基、据付配管 1式
〃	〃 〃 〃 電気設備工事	富士電機(株)	H4.9.28～H5.3.18	運転操作、計装設備 1式
H21	汚泥貯留槽改修工事	(株)双成化建	H21.6.8～H21.12.18	No.1･2貯留槽内の防食塗装
	計			

汚泥脱水施設

年 度	工　　事　　名	請 負 業 者	工　　期	工　　事　　概　　要
S.52	脱水機棟建設工事	(株)間　組		RC造、地下1階、地上2階　　2,646m2
〃	〃　〃　建築付帯設備工事	岩谷工業(株)		空調、給排水衛生設備、消火設備
〃	〃　〃　建築付帯電気工事	(株)日本電管工業		照明、動力、弱電他
S.53	脱水機棟建設工事(その2)	(株)間　組		外壁仕上、ガラス他
〃	クレーン設置工事	(株)日立製作所		天井走行クレーン　7.5t吊(脱水機棟、放流ポンプ棟)
S.54	汚泥脱水設備工事	日立ﾌﾟﾗﾝﾄ建設(株)	S54. 7.13～S55. 2.10	横型ベルトプレス2基、ケーキ搬出機、ピット撹拌機他
〃	汚泥処理電気設備工事	富士電機製造(株)	S54. 9.18～S55. 3.25	濃縮タンク、脱水機棟(一部)電気設備
〃	〃　　〃　　(その2)	〃	S54.11.26～S55. 3.25	変圧器盤、操作盤、ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀｰ、(脱水機棟電気設備)
〃	建築施設床仕上工事	(株)間　組	S54. 9. 1～S55. 3.25	脱水機棟、濃縮タンク電気室シンダーコン及び仕上げ
〃	脱水機棟床仕上げ工事	〃	S54.12.25～S55. 3.25	脱水機棟(ポンプ室、搬入室、コンベア室、ボイラ室、脱臭機室)シンダーコン及び仕上げ
S.57	汚泥脱水機機械設備工事(増設)	日立ﾌﾟﾗﾝﾄ建設(株)	S57.12. 9～S58. 3.30	横型ベルトプレス1基、No.2ケーキ搬出機、汚泥ポンプ他
〃	汚泥脱水電気設備工事(増設)	富士電機(株)	S57.12. 9～S58. 3.30	ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀｰ 1式、現地盤 1面、指示計、記録計各2台
S.61	脱水機棟及びﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞｱ脱臭設備工事	日立ﾌﾟﾗﾝﾄ建設(株)	S61.12.22～S62. 3.18	ダクト工事　1式、ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞｱｶﾊﾞｰ取付　1式、臭突取付　1式
S.62	汚泥脱水機機械設備工事(増設)	〃	S62. 9.19～S63. 2.29	汚泥脱水機機械設備　1式
〃	汚泥脱水機電気設備工事	富士電機(株)	S62. 9.19～S63. 2.29	汚泥脱水電気設備　1式
〃	汚泥脱水機機械設備工事その2	日立ﾌﾟﾗﾝﾄ建設(株)	S62.12.12～S63. 2.29	No.7ケーキ搬出機　1基
H. 4	既設高圧盤CT取替工事	富士電機(株)	H 5. 2.22～H 5. 3.18	既設高圧盤改造　1式
H. 8	汚泥脱水機棟増築工事	(株)樋川建設	H 8. 8.12～H 9. 3.18	RC造2階建、建築面積　239.86m2、延床面積　409.73m2
H. 9	汚泥脱水機増設(機械設備)工事	日立ﾌﾟﾗﾝﾄ建設(株)	H 9. 7.31～H10. 3.30	遠心脱水機　30m3/H　1基、脱水ケーキ圧送設備
〃	〃　〃　(電気設備)工事	富士電機(株)	H 9. 7.31～H10. 3.30	受電、配電設備、運転制御、監視操作設備
H19	汚泥脱水機更新機械設備工事	(株)日立プラントテクノロジー	H19.8.30～H20.3.18	No.6脱水機設置(スクリュープレスφ800)
〃	汚泥脱水機更新電気設備工事	横河電気(株)環境システム営業本部	H19.8.30～H20.3.18	脱水機設置に伴う工事
H20	脱水機棟脱臭設備更新工事	住友重機械エンバイロメント(株)	H20.10.29～H21.10.30	生物脱臭装置設置
〃	脱水機棟空調設備更新工事	共和総合設備(株)	H21.2.16～H21.6.30	空調、照明更新
H23	汚泥脱水機更新(機械設備)工事	㈱クボタ　東京本社	H24.9.13～H25.7.29	・標準型ベルトプレス　2基　・ケーキ搬出機　3台
〃	汚泥脱水機更新(電気設備)工事	㈱明電舎	H24.9.13～H25.7.29	電気設備工事(運転操作・計装設備)1式
〃	汚泥脱水機更新(機能増設)工事	横河電機㈱	H24.12.21～H25.7.29	監視制御システム機能増設　1式
H26	脱水機棟制御計装電源用UPS更新工事	シティメンテナンス㈱	H26.9.29～H27.1.20	汎用型UPS装置(6KVA)2台
	計			

汚泥焼却施設

年 度	工　　事　　名	請 負 業 者	工　　期	工　　事　　概　　要
H. 2	汚泥焼却施設築造工事（土木）	吉沢建設（株）	H 2.10.15～H 3. 3.25	焼却炉、ケーキ搬出機基礎　1式、HPφ450　61m、1号　2箇所
〃	汚泥焼却施設建設に伴う植木の移植	（株）石原ｸﾞﾘｰﾝ建設	H 2.10.25～H 2.12. 8	椿　2本、金木犀　15本、白樫　2本、楠　8本、ｵｵﾑﾗｻｷ 90株他
H. 3	汚泥焼却施設建設工事（機械設備）	月島機械（株）	H 3. 8.22～H 4. 9.16	50t/日　1基、排煙処理塔　1基、湿式電気集塵機　1基
〃	〃　　〃　　（電気設備）	（株）高岳製作所	H 3. 8.22～H 4. 9.16	運転操作、監視制御設備　1式
〃	〃　　築造工事（土木）	吉沢建設（株）	H 3.10. 3～H 4. 3.18	焼却炉、ケーキ搬出機基礎　1式、HPφ450　15.75m、1号1箇所
H25	甲府市浄化センター汚泥焼却施設増設（機械設備）工事	月島機械（株）	H25.6.17～H27.9.30	汚泥焼却炉　処理量60t／日　1式
〃	甲府市浄化センター汚泥焼却施設増設（土木設備）工事	小沢建設㈱	H25.12.18～H26.7.29	焼却炉基礎盤工　1箇所・基礎杭30本・コンベヤ基礎工7箇所
〃	甲府市浄化センター汚泥焼却施設増設（電気設備）工事	メタウオーター㈱	H26.2.10～H27.9.30	銃変電設備1式・運転操作設備1式・計装設備1式・監視制御設備1式
H26	甲府市浄化センター汚泥焼却施設地下タンク基礎工事	㈲ヒロセコンストラクション	H26.5.16～H26.12.12	コンクリート基礎1式、杭4本
	計			

汚泥コンポスト施設

年 度	工　　事　　名	請 負 業 者	工　　期	工　　事　　概　　要
S.56	汚泥コンポスト施設一次発酵槽築造工事	北清建設(株)	S57. 3.18～S57. 8. 4	RC造、平屋建　157.5m2
〃	〃　〃　二次発酵槽築造工事	(株)間　組	S57. 3.18～S57. 8. 4	鉄骨造(杭、基礎のみ)、建築面積　2,478.48m2
〃	〃　〃　前処理棟築造工事(第1期)	(株)望月建設	S57. 3.18～S57. 8.14	RC造、一部地下1階　309.4m2
〃	〃　〃　オガクズ棟築造工事(第1期)	井口工業(株)	S57. 3.18～S57. 8.14	鉄骨平屋建一部地下1階、建築面積　752.72m2
〃	〃　〃　受変電室築造工事	(有)大野工務店	S57. 3.18～S57. 7.15	RC造、平屋建　77.49m2
〃	〃　〃　機械設備工事(製品貯留槽)	松坂貿易(株)	S57. 3.18～S57. 8. 4	製品貯留槽　50m3
S.57	〃　〃　二次発酵槽築造工事(第2期)	(株)間　組	S57. 7.12～S58. 2. 6	鉄骨造、建築面積　2,478.48m2、軒高　8.2m
〃	〃　〃　オガクズ棟築造工事(第2期)	井口工業(株)	S57. 7.　1～S57.11.19	鉄骨平屋建一部地下1階、建築面積　752.72m2、軒高6.8m
〃	〃　〃　前処理棟築造工事(第2期)	(株)望月建設	S57. 7.12～S58. 2. 6	RC造、一部地下1階、2階建、延床　595.81m2、軒高8.0m
〃	二次発酵槽消火設備工事	(株)間　組	S57. 8.28～S58. 2. 6	消火設備、電気工事
〃	汚泥コンポスト施設機械設備工事(一次発酵槽)(二次発酵槽)	松坂貿易(株)	S57.10. 4～S58. 3.30	一次・二次発酵槽および付属機器設備
〃	〃　〃　移送コンベア基礎工事	北清建設(株)		鉄筋コンクリート基礎(2台)、モルタル金鏝仕上げ
〃	〃　〃　機械設備工事(No.1移送コンベア)	松坂貿易(株)		No.1移送コンベア
〃	〃　〃　一次発酵槽(下部構造物)機械基礎	(株)間　組		RC基礎、モルタル金鏝仕上、建物廻り雨水排水
S.58	〃　〃　機械設備工事	松坂貿易(株)	S58. 7.15～S58. 3.20	オガクズ圧送、二次発酵、前処理、包装、電気計装設備
〃	〃　〃　受変電設備工事	富士電機製造(株)	S58. 6.25～S59. 1.31	受変電設備
〃	〃　〃　建築付帯電気設備工事	(株)広田電工社	S58.11. 4～S59. 1.31	
〃	〃　〃　受変電設備高圧引出盤増設工事	富士電機製造(株)	S58.11. 4～S59. 1.31	
〃	〃　〃　機械設備工事(計量装置)	松坂貿易(株)	S58.11. 4～S59. 1.31	前処理計量装置、バラ積貯留槽計量装置
S.60	〃　〃　鋸屑篩分設備工事	太平洋金属(株)	S60.11.18～S61. 3.17	
〃	〃　〃　整備工事	深沢工務店	S61. 1. 8～S61. 3.18	二次発酵槽操作室改修、鋸屑棟防音、プロパン庫設置
〃	倉庫建設工事	丸加工業(有)	S61. 2. 4～S61. 3.18	プレハブ造平屋建　32.4m2、基礎　コンクリートブロック
S.61	汚泥コンポスト施設整備工事(その1)	竹田組工業(株)	S61. 8. 4～S61. 9.22	鉄骨造　53m2、
〃	コンポストストックヤード築造工事	(有)丹沢工業	S61. 9. 1～S62. 3.18	鉄骨造平屋建　451.65m2、軒高　6.2m、屋根　長尺カラー折板
S.62	脱臭設備ミストセパレータ設置工事	北炭化成工業(株)	S62.12.11～S63. 1.21	

年　度	工　　事　　名	請 負 業 者	工　　期	工　　事　　概　　要
S.62	製品切り返し用ベルトコンベア設置工事	太平洋金属(株)	S62. 7.11～S62. 9. 8	7-1、7-2製品引出コンベア、排風機　各1台
〃	汚泥コンポスト施設換気設備及び点検台設置工事	(有)宮本水工設計	S63. 2. 1～S63. 3.16	ｺﾝﾍﾞｱ換気配管、操作室換気設備、ｺﾝﾍﾞｱ点検台設置
〃	コンポスト施設包装場照明器具増設工事	小山電気工業(株)	S63. 2.18～S63. 3. 8	照明器具　FL40W　×2　4台
S.63	〃　〃　二次操作室包装場脱臭設備工事	甲信管工(有)	S63. 7. 4～S63. 9.24	排風機　15m3/M　200mmAq　、電気配線　142m
〃	〃　〃　ストックヤード築造工事	南伸建設(株)	S63. 9.12～S63.10.31	テント倉庫　10m×49.5m　495m2、重量ラック(ビーム2段)54台
〃	〃　〃　一次発酵槽機械室脱臭設備工事	(有)日成住宅設備	S63. 9. 8～S63.10.12	配管延長　200A　36m、150A　4m、100A　28m
〃	〃　〃　前処理棟事務室改修工事	日原建設(株)	H 1. 1.12～H 1. 3.18	建築、給排水衛生設備、電気設備工事
〃	前処理棟事務室(給排水衛生設備)工事	浅井工業所	H 1. 1.12～H 1. 3.18	給排水衛生ガス空調設備
〃	前処理棟事務室(電気設備)工事	加賀美電気商会	H 1. 1.12～H 1. 3.18	電灯コンセント、弱電火報設備
〃	コンポスト施設包装場土間排水工事	丸加工業(有)	H 1. 2. 2～H 1. 3. 3	鉄筋コンクリートU型　52.2m、グレーチング　52.2m
H.16	コンポスト施設包装設備改修工事	太平洋機工(株)		
	計			

その他

年度	工事名	請負業者	工期	工事概要
S.48	流入路及び場内整備	(株)島津組		
〃	搬入路築造工事	高木組		
〃	電力設備工事	(株)間 組		
〃	地質調査工事	大成基礎設計		
S.51	流入管布設工事	(株)間 組		φ2,400 202.3m、 特人 2箇所
〃	流入管布設に伴う止水工事	〃		薬液注入 11,000L
S.53	場内整備工事(流川改修)第1工区	(株)島津組		左岸 95m、 右岸 170m、 改修幅 15.5m
〃	〃 〃 第2工区	長田組土木(株)		左岸 155m、 右岸 155m、 改修幅 15.5m
〃	場内汚水排水管布設工事	早川工業(株)		φ900 309.28m、 2号マンホール 2箇所
S.54	〃 〃	〃	S54.6.28～S54.12.4	φ900 226m、φ600 126m、φ500 200m他、 1号10、2号5箇所
〃	汚泥処理施設用地整地工事	〃	S54.9.14～S54.10.4	整地工 8,000m2
〃	場内整備工事(流川河川改修)	(株)島津組	S54.12.27～S55.3.25	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁 375m、ブロック積工 1,870m2、右岸 155m、左岸 220m
〃	場内2号橋築造工事	長田組土木(株)	S54.12.25～S55.3.25	PC桁、橋長 7.5m、幅員 6.0m
〃	場内汚水排水管布設工事(その2)	早川工業(株)	S55.1.14～S55.3.25	φ400 84m、φ300 67m、φ200 91m他、MH900 5、700 2、600 3箇所
〃	構内電柱移設工事	高野電工	S55.1.14～S55.1.25	電柱移設、架線工事
〃	外灯設備工事	内外電気興業	S55.3.7～S55.3.29	照明設備、塗装工事、通信線設備
〃	場内整備工事(流川河川改修)に伴う仮設道路工事	(株)島津組	S55.2.4～S55.3.29	ｺﾝｸﾘｰﾄ管 9.72m、2連 19.44m、盛土 155m
〃	搬入路法面保護工事	〃	S55.2.4～S55.3.29	法面保護工 矢板 9m 41枚、安全シート 194m2、仮設道路 75m
S.55	仮設道路工事	早川工業(株)	S55.4.21～S55.5.15	L=63m、 W＝10
〃	〃 (その2)	〃	S55.5.22～S55.7.20	盛土工 6,680m3、路盤工 2,640m、空土羽工 940m2
〃	工事用搬入路撤去工事	(株)島津組	S55.5.13～S55.8.10	搬入路撤去、堤防復旧、橋梁撤去工事
〃	場内整備工事(流川法面保護)	〃	S55.7.28～S55.8.16	蛇籠設置工、土嚢設置工
〃	〃	早川工業(株)	S55.8.6～S55.8.20	豆砂利敷地工655.8m2、不陸整工(人力)1,026.5m2(機械)3,650m2
〃	防災施設工事	南伸建設(株)	S55.8.21～S55.10.9	
〃	建物廻り雨水排水管設備工事	(有)日本パイピング工業	S55.10.17～S55.12.25	L=418m、桝 21箇所

年 度	工　　事　　名	請 負 業 者	工　　期	工　　事　　概　　要
S.55	場内雨水管布設工事	長田組土木(株)	S55.10.17～S56. 2.12	φ1,100　7.2m、φ900　136m、φ700　69m、φ600　90m
〃	場内水路改修工事	平賀建設(株)	S55.10.17～S56. 2.13	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1.0×1.0　12m、側溝L=198m
〃	場内整備工事(流川河川改修)	(株)島津組	S55.11. 1～S56. 2. 8	天端ｺﾝｸﾘｰﾄ　127.5m、CB積工628m2、基礎工　134.7m
〃	場内雨水管布設工事(その2)	〃	S55.11. 1～S56. 2.12	φ1,000　40m、φ900　25.6m、φ800　24.2m、φ700　40m、φ650　26.8m他
〃	建物施設床仕上工事	(株)間　組	S55.11. 1～S56. 2.17	278m2、シンダー　57.2m2、鉄筋　1式
〃	場内整備工事	早川工業(株)	S56. 3. 5～S56. 3.30	盛土工　8,880m3、MH設置工　3箇所、管布設工　31.65m
〃	水路改修工事(その1)	新興建設(株)	S56. 3. 5～S56. 3.30	土工、側溝工、小版工、雑工.
〃	〃　〃(その2)	古久保建設	S56. 3. 5～S56. 3.30	土工、側溝工　128.8m、雑工.
〃	汚泥用地整備工事	(有)長田工業	S56. 3. 5～S56. 3.30	L=139m、フェンス設置工　138m
〃	場内整備工事(盛土その2)	平賀建設(株)	S56. 3. 5～S56. 3.30	盛土4,811m3
S.56	場内雨水管布設工事	(有)長田工業	S56. 6.18～S56. 9.11	φ700　62.97m、φ350　49.93m
〃	場内整備工事(境界擁壁)	早川工業(株)	S56. 7.17～S576. 1.17	擁壁工　L=690m、フェンス取付工　L=690m
〃	場内汚水管布設工事	松田組	S56. 7.27～S56. 9.24	φ400　30.45m
〃	水路改修工事	原田建設	S56. 7.27～S56. 8.18	土工　1式　5.5m
〃	汚泥用地整備工事	(有)長田工業	S56.10.15～S56.12.28	整地工　1,910m3
〃	場内整備工事(道路)	早川工業(株)	S56.11.19～S57. 3.20	歩道舗装工　320m2、車道　4,050m2、L型側溝　995m2
S.57	場内一号橋上部架設工事	(株)コミヤマ工業	S57. 7. 5～S57. 9. 2	単純活荷重合成H型鋼橋、L=17.5m、幅員　6.7m
〃	場内整備工事1工区	平賀建設(株)	S57. 7. 5～S57. 9.12	擁壁工　L=126m、フェンス取付工　L=126m、付帯工　1式
〃	場内整備工事2工区	(有)長田工業	S57. 7. 5～S57.10.12	擁壁工　L=153m、フェンス取付工　L=153m、L型側溝　84m
〃	場内整備工事3工区	(有)奥石産業	S57. 7. 5～S57. 8.23	擁壁工　L=68m、フェンス取付工　L=140m、付帯工　1式
〃	条件道路改良工事	山田土建(有)	S57.11. 1～S58. 1. 9	舗装　280m2、U型側溝　70m、L型　29.5m、側壁　41m
〃	修景施設植栽工事(第2期)その1	今井造園土木(株)		高木　26本、中木　25本、低木　205本、下草　476m2
〃	〃　〃　その2	(株)宮崎造園		高木　30本、中木　18本、低木　178本、下草　345m3
〃	〃　〃　その3	富士緑化(株)		高木　122本、中木　18本、低木　318本、下草　761.8m4
〃	場内整備工事(境界擁壁)	(有)長田工業		擁壁工　L=55m、フェンス取付工　L=55m、付帯工　1式
〃	〃　〃(道路)	(株)三枝組		L型1,043m、歩車道境界84m、雨水桝(1.0H)6箇所

年 度	工　　事　　名	請 負 業 者	工　　期	工　　事　　概　　要
S.57	場内整備工事(舗装)	(株)早野組		補装工(車道) 2,553m2、(歩道) 133m2
〃	〃　〃 (舗装)	〃		補装工(車道) 2,395m2、(歩道) 20m2、L型ブロック171m他
〃	〃　〃 (流川河川改修第一工区)	長田組土木(株)		天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 158m、CB積工538m2、基礎工 98.5m
〃	〃　〃 (流川河川改修第二工区)	(株)島津組		天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 292m、CB積工1,453m2、基礎工 292m
〃	場内道路整備工事(盛土)	平賀建設(株)		盛土工 1式、φ300 13m、1号人孔 2箇所
〃	場内照明設備工事(その1)	(有)松永電工		外灯設備工 1式、開閉器増設工 1式
〃	〃　〃 (その2)	(株)松島電工社		外灯設備工 1式
〃	〃　〃 (その3)	甲陽電気(株)		外灯設備工 1式
〃	場内道路整備付帯工事(給水管布設)	(有)宮本水工		上水給水管布設 1式
〃	受変電引込建柱工事	(有)松永電工		ｺﾝｸﾘｰﾄ柱建柱工 12m 1本、撤去工 1式
〃	場内整備工事	浅井エクステリア工業		フェンス設置工 34m、雨水桝 3箇所、取付管8.5m
〃	〃　〃	〃		フェンス設置工 12m
S.58	雨水排水管布設工事	大栄土木建設(株)	S58. 8.18～S58. 9.14	φ500 36m、φ400 56m、φ300 89.95m、φ250 79.8m、1号人孔5、2号1箇所
〃	場内汚水排水管布設工事	〃	S58. 7.11～S58. 8.18	φ250 94.8m、1号人孔 2箇所
〃	場内整備工事(フェンス)	山田土建(有)	S58. 8. 8～S58. 9. 6	フェンス設置工 138m、擁壁工 5.5m
〃	〃　〃 (草刈工)	浅井エクステリア工業	S58. 9. 5～S58. 9.11	雑草刈 3,500m2
〃	〃　〃 (進入道路)	平賀建設(株)	S58.11. 4～S59. 3. 2	擁壁 46m、フェンス取付 46m、L型側溝 320m、処理水配管
〃	〃　〃 (整地)	〃	S60.10.16～S60.12.14	整地工 900m2、U型側溝 42m、境界ｺﾝｸﾘｰﾄ 44m
S.61	場内整備工事	大栄土木建設(株)	S61. 9. 1～S61.12. 9	擁壁90.5m、フェンス74m、側溝192.5m、ｸﾞﾗﾝﾄﾞ造成10,080m2
〃	修景施設植栽工事	三井造園土木	S62. 3. 6～S62. 3.30	シラカシ H5.0、W1.5、G30、 24本
H. 3	場内整備工その1(植栽工事)	(株)宮崎造園	H 3.11.25～H 4. 3.18	ハナミズキ 40本、サツキ 1,012本
〃	〃　その2(道路築造工事)	(有)古久保建設	H 3.12.13～H 4. 2.20	道路築造工 284m、L型側溝 1式
〃	場内整備工事 (その3)(植栽工)	三共造園土木	H 3.12.19～H 4. 3.30	シラカシ 20本
〃	〃　(その4)(舗装工事)	日東建設(株)	H 4. 1.27～H 4. 3.30	表層5cm 1,908m2、上層15cm 1,908m2、下層30cm 343m2、路床整備 343m2

年　度	工　　事　　名	請 負 業 者	工　　期	工　　事　　概　　要
H. 4	場内整備工事その１(道路舗装工)	(有)浅川組	H 4. 7.29～H 4. 9.24	道路舗装工　233m2、L型側溝　51.8m
〃	〃　　〃　その２(下水道管布設工)	丸加工業(有)	H 4. 8.10～H 4.10.18	φ150　41.5m、φ125　25m、ミニ人孔　1箇所、桝3箇所
〃	〃　　〃　その３(植栽工)	(有)荻野造園	H 5. 2.19～H 5. 3.18	シラカシ　H=4.5m　幹周　0.3m　39本
〃	〃　　〃　その４(植栽工)	大宮園	H 5. 2. 5～H 5. 3.18	アベリア　1,373本、キンモクセイ　24本
〃	〃　　〃　その５(道路反射鏡設置工事)	(株)道路企画	H 5. 2.15～H 5. 2.24	道路反射鏡　φ800　1基
H.12	場内整備工事	早野組、長田組土木、 三枝組JV	H12.10.26～H13. 1.23	補装工5cm　583m2、3cm　440m2、土間コン　705m2、水路工　16m
H21	場内返流水配管改修工事(その１)	(有)平誠工業	H21.11.19～H22.3. 8	塩ビ管布設工 (φ300)　L= 185.0 m (φ250)　L=　16.5m (φ150)　L=　15.5m 人孔設置工(1号･レジン)5箇所 人孔設置工(小型)4箇所 付帯工　　1式
〃	場内返流水配管改修工事(その２)	(有)丸茂工業所	H21.11.19～H22.3. 8	塩ビ管布設工 (φ300)　L= 125.3m (φ150)L=　14.0m 人孔設置工(1号･レジン)5箇所 人孔設置工(小型)1箇所 付帯工　　1式
H25	公用車用車庫設置工事	藤沢鉄工㈱	H26.2.5～H26.3.13	土工事1式、屋根工事1式、鉄骨工事1式
H27	排水管復旧工事	(有)平誠工業	H27.10.16～H28.2.3	リブ付塩ビ管布設工φ400L＝102.5m、φ300L＝2.1m、φ250L＝14.9m、管路清掃工φ900L＝612m
	計			

設 計 等 委 託 業 務

年 度	工　　事　　名	請 負 業 者	工　　期	工　　事　　概　　要
S.50	実施設計委託業務	(株)日本水道コンサルタント		
S.57	汚泥コンポスト施設建設工事監理	日本理水設計(株)		
〃	電気設備工事監理	(株)東京設計		
〃	コンポスト化調査研究	山梨大学研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ		
〃	汚泥コンポスト施設建設工事監理(第2期)	日本理水設計(株)		
〃	汚泥貯留タンク施設実施設計	(株)日本水道コンサルタント		
〃	受電柱移設工事補償金	東京電力		
H. 1	汚泥焼却施設実施設計業務	(株)日水コン	H 2. 1.11～H 2. 3.30	詳細設計(土木、建築、機械、電気)
H. 5	電気施設実施設計業務	(株)日水コン	H 5. 6.28～H 6. 3.18	特高変電施設(基本、詳細)、自家発電施設(詳細)
〃	汚泥脱水施設実施設計業務	〃	H 5. 6.28～H 6. 3.18	(基本、詳細設計)
H. 8	第四系列実施設計業務	(株)日水コン	H 8.11.11～H 9. 3.31	基本、詳細設計　1式
〃	地質調査業務	(株)山梨技術研究所	H 8.12.20～H 9. 1.31	ボーリング　3箇所、深度　22m、孔径　66mm、水位、貫入、粒度試験
H. 9	汚水ポンプ設備他増設設計業務	日本工営(株)	H 9.10. 1～H10. 3.30	汚水ポンプ　70m3/分、砂ろ過　4,000m3/日
H.10	特高受変電設備実施設計業務	(株)日水コン	H10.11.18～H11. 3.18	特高受変電設備の土木構造物の見直し設計
H.18	甲府市浄化センター汚泥脱水機更新設計業務	(株)日水コン	H18．7.10～H19. 2.28	汚泥脱水機更新設計業務(機械設計、電気設計、設計協議)
〃	甲府市浄化センター曝気沈砂池更新設計業務	〃	H18.12.21～H19. 3.23	曝気沈砂池更新設計業務(機械設計、電気設計、設計協議)
H19	中央監視設備更新設計業務	パシフィックコンサルタンツ(株)	H19.7.17～H20.1.31	遠方監視制御設備更新設計業務電気設計　一式設計協議　一式
H21	耐震診断調査業務	サンコーコンサルタント(株)	H21.9.24～H22.3.1	ポンプ棟耐震診断(土木・建築)、基礎調査
〃	管理本館空調設備他更新設計業務	(株)三宅建築設計事務所	H21.11.18～H22.3.1	機械設計、電気設計、設計協議、現地調査
〃	甲府市浄化センター受変電設備更新設計業務委託	(株)日水コン	H21.12.21～H22.3.26	電気設計、設計協議
H22	甲府市浄化センター処理水ポンプ棟他耐震診断調査業務委託	サンコーコンサルタント㈱山梨営業所	H22.9.16～H23.2.28	ポンプ棟(土木・建築)基礎調査及び耐震診断　1式　他(土木・建築)基礎調査　1式
〃	甲府市浄化センター塩素滅菌棟設備他更新設計業務委託	㈱日本水道設計社甲府営業所	H22.12.10～H23.2.28	塩素滅菌棟設備他更新設計業務　　1式
H23	甲府市浄化センター下水汚泥処理基本計画見直し業務委託	日本上下水道設計㈱山梨出張所	H23.5.9～H24.3.16	汚泥処理基本計画の見直し、全体計画の変更、下水道事業認可の変更
〃	甲府市下水道長寿命化詳細計画策定業務委託(処理場・ポンプ場施設)	日本工営㈱甲府営業所	H23.7.8～H24.3.16	処理場・ポンプ場施設の長寿命化計画策定業務
〃	甲府市浄化センターブロワ棟他耐震診断調査業務委託	サンコーコンサルタント㈱山梨営業所	H23.7.19～H24.2.29	耐震診断業務(ブロワ棟、第一曝気沈砂池、住吉中継ポンプ場)
〃	甲府市浄化センター汚泥脱水機更新設計(H23)業務委託	㈱日本水道設計社 甲府営業所	H23.8.26～H24.3.23	汚泥脱水機更新設計業務
H24	最初沈殿池他耐震診断調査業務委託	サンコーコンサルタント㈱山梨営業所	H24.7.13～H25.2.28	最初沈澱池他耐震診断調査業務　1式
〃	汚泥焼却施設増設設計業務委託	(株)日水コン山梨事務所	H24.7.17～H25.2.28	汚泥焼却施設増設設計業務(土木・建築・機械・電気)　1式
〃	スクリーンポンプ棟耐震補強設計業務委託	サンコーコンサルタント㈱山梨営業所	H24.7.30～H25.2.28	スクリーンポンプ棟耐震補強設計委託　一式
H25	スクリーンかす設備更新設計業務委託	㈱浪速技研コンサルタント	H25.7.1～H26.6.25	機械設計1式、電気設計1式、設計協議1式、現地調査1式
H26	砂ろ過設備更新設計業務委託	㈱日水コン	H26.6.16～H27.6.5	機械設計1式、電気設計1式、設計協議1式、現地調査1式
〃	スクリーンポンプ棟耐震補強工事監理業務委託	サンコーコンサルタント㈱	H26.6.19～H27.3.5	工事監理　1式
〃	住吉ポンプ場耐震診断調査業務委託	サンコーコンサルタント㈱	H26.7.25～H27.3.5	雨水ポンプ場耐震診断　土木・建築　1式
〃	住吉ポンプ場監視制御設備更新設計業務委託	㈱日水コン	H26.9.16～H27.8.5	電気設計1式、設計協議1式、現地調査1式
H27	甲府市浄化センター耐震診断調査業務委託	サンコーコンサルタント㈱	H27.9.10～H28.3.4	管理棟耐震診断(建築)1式、脱水機棟耐震診断(建築・土木)1式
H28	第1～3系列最初沈殿池耐震診断調査業務委託	サンコーコンサルタント㈱	H28.7.1～H29.3.3	第1～3系列最初沈殿池耐震診断(L2´)1式
	計			

住吉ポンプ場・雨水ポンプ場・池添ポンプ場

年 度	工　　事　　名	請 負 業 者	工　　期	工　　事　　概　　要
S.63	汚水中継ポンプ場築造工事その１			鉄筋コンクリート造 2,363.44㎡
〃	汚水中継ポンプ場流入管布設工事第1工区			φ900mmL=113.1m,φ1800mmL=112.1m
〃	汚水中継ポンプ場流入管布設工事第2工区			φ1000mmL=101.9m
H.1	汚水中継ポンプ場地上部建築工事（建築主体）			鉄筋コンクリート造　地上3階　4,101.11㎡
H.1	汚水中継ポンプ場地上部建築工事（建築附帯空調機械設備）			空気調和機　4基、換気用送風機　16基、換気扇　18基
H.1	汚水中継ポンプ場地上部建築工事（建築附帯衛生機械設備）			加圧給水装置　1基、ガス湯沸し器　3台
H.1	汚水中継ポンプ場地上部建築工事（建築附帯電気設備）			電気設備　1式
H.1	汚水中継ポンプ場機械設備工事（低段沈砂池設備）			粗目スクリーン　2基、細目スクリーン　2基、かす搬出機　2基
H.1	汚水中継ポンプ場機械設備工事（低段主ポンプ設備）			水中汚水ポンプ　3基、鋳鉄管弁類　1式
H.1	汚水中継ポンプ場建設に伴う附帯工事その１			防水工事603㎡、雑工事1式
H.2	汚水中継ポンプ場（電気設備工事）			受変電、自家発、運転操作設備　1式
H.2	汚水中継ポンプ場（高段ポンプ設備）			汚水ポンプφ600　4台、電動機　4台、給水装置類他　1式
H.2	汚水中継ポンプ場（高段沈砂池設備）			スクリーン自動除塵機　4基、沈砂掻揚機　3基、搬出機　14基
H.2	汚水中継ポンプ場（電気設備工事その２）			遠方監視制御設備　1式
H.2	汚水中継ポンプ場建設に伴う付帯工事			機械据付コンクリート打設　1式
H.2	汚水中継ポンプ場現場搬入路築造工事			仮設道路（砂利）　1式
H.2	円形沈澱池改修工事（機械設備）			汚泥掻寄機修繕　1式、鋳鉄製ゲート　2門、池排水ポンプ　1台
H.2	円形沈澱池改修工事（電気設備）			運転操作設備、計装設備、監視制御設備　1式
H.3	滅菌設備改良工事（機械設備）			次亜塩素酸ソーダ貯留槽、注入ポンプ
H.3	滅菌設備改良工事（電気設備）			運転操作設備、計装設備、監視制御設備　1式
H.3	施設改修工事			滅菌設備改修、動力設備改修、既設設備補修等
H.3	流入ゲート設置工事			沈砂池流入ゲート改修
S.63	実施設計業務委託（流入管）その２			推進、開削
〃	住吉合流ポンプ場実施設計業務委託			ポンプ場詳細設計
H.2	汚水中継ポンプ場建設に伴う既設施設の改修委託			ポンプ施設、円形沈殿池、塩素混和池
H.3	池添ポンプ場施設改良設計			ポンプ設備全体の改良検討設計
H.4	雨水ポンプ場沈砂池覆蓋築造工事			沈砂池覆蓋・鉄骨平屋建　578.41㎡
H.4	雨水ポンプ場改築工事（電気設備）	㈱明電舎	H5.1.18～H5.12.24	受配電設備、運転操作設備、監視計装設備
H.4	雨水ポンプ場改築工事（ポンプ設備）	㈱酉島製作所	H5.1.18～H5.12.24	雨水ポンプ（600φ　3台　700φ　1台）
H.4	池添ポンプ場改築工事（電気設備）	富士電機㈱	H5.1.18～H5.9.24	受配電設備、運転操作設備、監視計装設備
H.4	池添ポンプ場改築工事（ポンプ設備）	㈱電業社機械製作所	H5.1.18～H5.9.24	雨水ポンプ（400φ　1台　600φ　1台）
H.4	池添ポンプ場改築工事（沈砂池設備）	三機工業㈱	H5.1.18～H5.9.24	自動除塵機　2台、沈砂池覆蓋
H.5	池添ポンプ場屋外燃料タンク設置工事	富士電機㈱	H5.9.22～H5.10.21	燃料タンク（600L）　同建屋（9．3㎡）

H.23	下水道処理施設撤去工事	山本基礎工業㈱	H23.12.15～H24.4.20	高速散水ろ床撤去工　4池
H.23	簡易処理施設高度化工事（土木）	早野組・長田組JV	H24.3.12～H26.3.4	処理施設躯体　1基
H.24	簡易処理施設高度化（機械設備）工事	メタウォーター㈱	H24.6.29～H26.3.3	雨天時高速下水処理システム 高速ろ過池3.2mW×4.95mL×2.85mH
H.24	簡易処理施設高度化（電気設備）工事	㈱明電舎	H24.7.30～H26.3.3	運転操作設備　1式、計装設備　1式、監視制御設備　1式
H25	住吉ポンプ場無停電電源装置更新工事	㈱明電舎	H25.8.23～H26.2.19	整流器盤1面、蓄電池盤1面、インバーター盤1面、直流分電盤1面
〃	住吉ポンプ場高段沈砂掻揚機他チェーン・スプロケット更新工事	藤沢鉄工㈱	H25.9.6～H26.3.4	No.1高段沈砂搬出機主務スプロケット、チェーン、フライト・掻揚機スプロケット他
H26	住吉ポンプ場高段沈砂掻揚機駆動装置更新工事	藤沢鉄工㈱	H26.8.21～H27.2.16	高段No.1沈砂掻揚機後部側主務スプロケット1式、高段No.2.3沈砂掻揚機後部側主務チェーン・スプロケット1式、高段No.2.3沈砂搬出機駆動後部側主務チェーン・スプロケット1式
〃	簡易処理施設周辺整備工事	丸吉工業㈱	H26.12.1～H27.3.11	表層工、鉄筋コンクリートL型58.7m、円形水路設置工15m、PU側溝設置工33.6m、塩ビ管布設工φ150L＝4.7m他

(4)対象施設小規模修繕履歴

対　象　施　設　小　規　模　修　繕　履　歴

No.	年　　度	施設分類	設備分類	工 種	細 分	修　　繕　　工　　事　　名
1	平成23年度	その他	本館	機械	ポンプ	管理本館空調機械室　床排水ポンプ修繕工事
2	平成23年度	水処理	池添	機械	配管	池添ポンプ場　給水管漏水調査
3	平成23年度	水処理	ブロワー	電気	防災	ブロワー棟1階　煙感知器取替工事
4	平成23年度	水処理	砂ろ過	電気	防災	ハロン設備　非常電源蓄電池　交換工事
5	平成23年度	水処理	砂ろ過	機械	ポンプ	ろ布洗浄水ポンプ・高架水槽揚水ポンプベアリング交換
6	平成23年度	水処理	スクリーン	機械	配管	No1・2細目除塵機グリス圧送配管継手交換
7	平成23年度	水処理	管廊	機械	配管	主管廊ろ過水給水管切回し工事
8	平成23年度	水処理	砂ろ過	機械	ポンプ	ろ布洗浄水ポンプ他軸継手ゴム交換
9	平成23年度	汚泥処理	脱水	電気	防災	No２９脱水機棟地下1階感知器回路断線修理
10	平成23年度	水処理	塩素	機械	配管	塩素漏洩修繕
11	平成23年度	汚泥処理	脱水	電気	計装	脱水機棟圧送ポンプ受入ホッパーレベルセンサー交換
12	平成23年度	その他	本館・脱水	機械	防災	消防設備修繕
13	平成23年度	水処理	住吉	電気	機器	住吉中継ポンプ場No2動力変圧器盤換気扇交換
14	平成23年度	水処理	自家発	機械	機械	自家発電気排気管伸縮継手交換
15	平成23年度	水処理	塩素	その他	防災	空気呼吸器空気詰替
16	平成23年度	水処理	ポンプ	電気	配管	ポンプ棟屋外電設用ハンドホール鉄蓋取付
17	平成23年度	汚泥処理	脱水	機械	機械	No3脱水機混合ドラム駆動ギア交換
18	平成23年度	汚泥処理	脱水	機械	防災	消火栓箱取替工事（1階コンベアー室）
19	平成23年度	水処理	自家発	機械	配管	管理本館北側　自家発冷却排水管修繕
20	平成23年度	水処理	ブロワー	機械	ポンプ	ブロワ棟No1．2冷却水ポンプグランドパッキン交換
21	平成23年度	水処理	終沈	機械	配管	No4余剰汚泥ポンプ逆止弁弁体交換
22	平成23年度	汚泥処理	脱水	機械	ポンプ	No1生汚泥移送ポンプ修繕工事
23	平成23年度	水処理	砂ろ過	機械	機器	No２スクリュー圧縮機24000時間点検整備
24	平成23年度	水処理	スクリーン	電気	制御	No2ポンプ井水位計修繕工事
25	平成23年度	汚泥処理	脱水	機械	ﾌｧﾝ	脱水機棟電気室送風機修繕工事
26	平成23年度	汚泥処理	脱水	機械	ポンプ	No2生汚泥移送ポンプ修繕工事
27	平成23年度	汚泥処理	脱水	機械	ポンプ	No12ろ布洗浄水ポンプベアリング交換工事
28	平成23年度	汚泥処理	脱水	機械	構造	No6脱水機汚泥供給ポンプ配管サポート新設工事
29	平成23年度	汚泥処理	脱水	機械	構造	脱水管廊生汚泥濃度計点検用足場設置
30	平成23年度	水処理	初沈	機械	配管	初沈2-1汚泥掻寄機・スカムスキマ給油装置部品交換
31	平成23年度	汚泥処理	脱水	機械	構造	脱水機棟ポンプ室送風機点検用足場設置
32	平成23年度	汚泥処理	脱水	電気	防災	脱水機棟搬入室誘導灯取替
33	平成23年度	水処理	本館	機械	防災	管理本館中央監視室排煙口修繕工事
34	平成23年度	水処理	スクリーン	機械	機械	No4細目除塵機修繕
35	平成23年度	水処理	終沈	機械	配管	終沈１－１グリス配管補修
36	平成23年度	水処理	砂ろ過	機械	配管	No3砂ろ過給水ポンプ逆止弁交換
37	平成23年度	水処理	終沈	機械	配管	終沈２－２汚泥掻寄機集中給油装置部品交換
38	平成23年度	水処理	砂ろ過	機械	ポンプ	砂ろ過棟No1床排水ポンプ修繕工事
39	平成23年度	水処理	初沈	電気	制御	No2汚水流量計指示値異常メーカー調査
40	平成23年度	水処理	終沈	機械	ﾌｧﾝ	１～３系終沈管廊排気ファン　電動機Vプーリー交換
41	平成23年度	汚泥処理	脱水	機械	配管	No5,6脱水機分離液配管交換工事
42	平成23年度	その他	本館	機械	配管	消火補助水槽ドレンバルブ交換
43	平成23年度	ｺﾝﾎﾟｽﾄ	一次	電気	制御	製品貯留槽設備シーケンサスイッチ取付
44	平成23年度	ｺﾝﾎﾟｽﾄ	二次	機械	ｺﾝﾍﾞｱ	二次施設No.6製品引出コンベアベルト修理
45	平成23年度	ｺﾝﾎﾟｽﾄ	二次	機械	ｺﾝﾍﾞｱ	二次施設No.4製品移送コンベアベルト修理
46	平成24年度	汚泥処理	脱水	機械	ポンプ	ろ布緊張油圧ユニット電動機修繕工事
47	平成24年度	水処理	曝沈	建築	附帯	第一曝沈棟シャッター修繕
48	平成24年度	その他	本館	機械	その他	本館南側量水機ボックス取替工事
49	平成24年度	水処理	終沈	機械	ポンプ	No２余剰汚泥ポンプ電動機ベアリング交換工事
50	平成24年度	建修	脱水	機械	ｺﾝﾍﾞｱ	非常用ケーキ搬出機サイクロ減速機（上側）修繕工事
51	平成24年度	水処理	曝沈	その他	清掃	No2-1分水可動堰沈砂除去
52	平成24年度	建修	脱水	建築	附帯	脱水機棟搬入室シャッター修繕工事
53	平成24年度	汚泥処理	脱水	電気	機器	水分計修理
54	平成24年度	水処理	砂ろ過	機械	調査	No３砂ろ過給水ポンプ用ストレーナ不具合調査
55	平成24年度	水処理	ｽｸﾘｰﾝ	機械	機械	スクリーンかす洗浄機掻揚機ブラシ軸交換工事
56	平成24年度	水処理	住吉	機械	機械	No２高段沈砂掻揚機チェーンガイド修繕工事
57	平成24年度	汚泥処理	貯留槽	電気	制御	No１汚泥貯留槽水位計修繕工事
58	平成24年度	水処理	砂ろ過	機械	配管	No２砂ろ過塔ろ抗配管修繕工事
59	平成24年度	水処理	住吉	機械	配管	円形沈殿池床排水ポンプ配管修繕工事
60	平成24年度	汚泥処理	脱水	機械	機器	No２空気減装置エアードライヤー交換工事
61	平成24年度	汚泥処理	脱水	電気	制御	ろ布緊張油圧ユニット圧力スイッチ交換工事
62	平成24年度	水処理	終沈	電気	計装	No４－２終沈汚泥掻寄機　電流計・変流器交換
63	平成24年度	水処理	住吉	電気	機器	水中ミキサー修繕工事
64	平成24年度	水処理	ｽｸﾘｰﾝ	電気	制御	流入渠水位計No１ポンプ井水位計修繕工事

対　象　施　設　小　規　模　修　繕　履　歴

No.	年　　度	施設分類	設備分類	工 種	細 分	修　　繕　　工　　事　　名
65	平成24年度	汚泥処理	脱水	電気	制御	NO1汚泥ピット水位計修繕工事
66	平成24年度	その他	本館	電気	機器	エレベーター機械室換気扇交換工事
67	平成24年度	水処理	ｽｸﾘｰﾝ	電気	照明	No3流入水路照明交換工事
68	平成24年度	水処理	初沈	機械	配管	初沈2－2グリス配管補修工事
69	平成24年度	水処理	曝沈	機械	ﾌｧﾝ	第2曝沈棟No2脱臭ファンVプーリー交換
70	平成24年度	その他	本館	電気	制御	消火補助水槽電極保持器箱、他修繕
71	平成24年度	水処理	曝沈	機械	ﾌｧﾝ	第2曝沈棟沈砂池室排気ファンVプーリー交換
72	平成24年度	水処理	終沈	機械	配管	No2返送汚泥ポンプ逆止弁交換工事
73	平成24年度	水処理	池添	電気	制御	監視盤警報設定器交換
74	平成24年度	水処理	砂ろ過	その他	その他	No2砂ろ過塔点検窓交換工事
75	平成24年度	汚泥処理	脱水	機械	機械	No3脱水機混合ドラム駆動ギヤ交換工事
76	平成24年度	汚泥処理	脱水	機械	ﾌｧﾝ	電気室送風機フィルター巻取り装置修繕
77	平成24年度	水処理	砂ろ過	機械	機器	No2消泡水用ストレーナグランド部修繕
78	平成24年度	汚泥処理	脱水	機械	機械	非常用ケーキホッパー開閉装置修繕工事
79	平成24年度	水処理	砂ろ過	その他	その他	No1砂ろ過塔点検窓交換工事
80	平成24年度	水処理	住吉	電気	低圧	No1高段汚水ポンプVVVF配線用遮断器交換
81	平成24年度	水処理	砂ろ過	その他	その他	砂ろ過給水ストレーナー吊具架台設置工事
82	平成24年度	水処理	初沈	機械	ﾌｧﾝ	初沈管廊排気ファン修繕工事
83	平成24年度	コンポスト	ｵｶﾞｸｽﾞ	建築	附帯	コンポスト施設シャッター修繕工事
84	平成25年度	水処理	ブロワー	機械	その他	ブロワクーリングタワー消音マット交換
85	平成25年度	汚泥処理	脱水	機械	清掃	濃縮汚泥移送配管清掃(地下管廊よりNo.1貯留槽)
86	平成25年度	汚泥処理	脱水	機械	配管	No.6脱水機低圧洗浄水配管交換工事
87	平成25年度	水処理	初沈	電気	制御	流量計修繕(1～3系初沈流量計)
88	平成25年度	水処理	住吉	機械	附帯	住吉ポンプ場監視室エアコン修理
89	平成25年度	汚泥処理	脱水	機械	配管	No.2薬品溶解タンク給水弁交換工事
90	平成25年度	汚泥処理	脱水	機械	機器	No.1機械濃縮機消耗部品交換工事
91	平成25年度	水処理	本館	機械	機器	自家発室給排風機用ガラリワイヤー交換
92	平成25年度	水処理	本館	機械	配管	空調機械室ろ過水配管バルブ交換工事(1)
93	平成25年度	水処理	本館	機械	配管	空調機械室ろ過水配管バルブ交換工事(2)
94	平成25年度	水処理	砂ろ過	建築	その他	ガラス入替え
95	平成25年度	水処理	脱水	電気	制御	終沈No.6-2汚泥掻寄機(下流メイン)電流計修繕
96	平成25年度	汚泥処理	脱水	機械	ポンプ	消臭剤ポンプ増設工事
97	平成25年度	水処理	曝沈	機械	調査	第1曝沈棟陥没箇所調査(カメラ調査)
98	平成25年度	汚泥処理	脱水	機械	ポンプ	脱水機棟地下No.1床排水ポンプ仕切弁交換
99	平成25年度	水処理	曝沈	機械	ポンプ	No.2沈砂池排水ポンプ修繕
100	平成25年度	コンポスト	ｵｶﾞｸｽﾞ	建築	附帯	オガクズ棟シャッター修繕(11/7応急分)
101	平成25年度	水処理	砂ろ過	機械	ポンプ	砂ろ過棟No.2床排水ポンプ修繕
102	平成25年度	汚泥処理	脱水	電気	制御	水位計修繕(No.2汚泥ピット・混合汚泥ピット)
103	平成25年度	汚泥処理	脱水	機械	機器	No.6脱水機本体点検窓(西側)交換
104	平成25年度	水処理	エアタン	機械	ポンプ	4系エアタン屋外床排水ポンプ修繕(本体オーバーホール)
105	平成25年度	汚泥処理	脱水	機械	ポンプ	濃縮槽No.2床排水ポンプ配管交換
106	平成25年度	汚泥処理	脱水	機械	機器	No.6脱水機本体点検窓(東側)交換
107	平成25年度	汚泥処理	脱水	機械	機器	No.6脱水機天井板受板交換
108	平成25年度	水処理	砂ろ過	機械	ポンプ	No.1砂ろ過給水ポンプ修繕
109	平成25年度	水処理	ブロワー	機械	機器	潤滑油ヒーター交換
110	平成25年度	水処理	ブロワー	機械	機器	No.2ブロワサイドグラス交換
111	平成25年度	水処理	ブロワー	機械	機器	主タンクサイドグラス交換
112	平成25年度	汚泥処理	脱水	機械	機器	No.6-2ケーキ搬出機テールプーリー他交換
113	平成25年度	汚泥処理	脱水	機械	機器	No.6-2ケーキ搬出機キャリアローラー自動調芯交換
114	平成25年度	水処理	終沈	機械	ポンプ	No.3余剰汚泥ポンプ逆止弁交換
115	平成25年度	汚泥処理	脱水	機械	機器	No.6-1ケーキ搬出機テールプーリー他交換
116	平成25年度	汚泥処理	脱水	機械	機器	No.6-2ケーキ搬出機リターンローラー自動調芯交換
117	平成25年度	水処理	分水槽	建築	その他	分水槽蓋取替
118	平成25年度	水処理	住吉	機械	附帯	プレハブ会議室エアコン修繕(応急対応)
119	平成25年度	汚泥処理	脱水	建築	その他	濃縮汚泥移送配管清掃用足場組立・配管取外し
120	平成26年度	汚泥処理	脱水	機械	附帯	監視室空調機修繕工事
121	平成26年度	水処理	初沈	その他	その他	転落防止柵設置工事AT1-1
122	平成26年度	水処理	初沈	その他	その他	転落防止柵設置工事AT1-4
123	平成26年度	水処理	住吉	機械	機器	低段細目除塵機修繕工事
124	平成26年度	水処理	本館	電気	附帯	本館屋上カメラ修理
125	平成26年度	汚泥処理	脱水	土木	その他	濃縮槽西側水路修理工事
126	平成26年度	汚泥処理	脱水	土木	その他	新脱水機棟北舗装修理工事
127	平成26年度	汚泥処理	住吉	機械	附帯	集会場空調設備工事
128	平成26年度	汚泥処理	脱水	機械	附帯	脱水機棟ポンプ室北東排風機点検用足場新設
129	平成26年度	汚泥処理	脱水	機械	機器	貯留槽攪拌ブロワチャッキ交換

対　象　施　設　小　規　模　修　繕　履　歴

No.	年　　度	施設分類	設備分類	工 種	細 分	修　　繕　　工　　事　　名
130	平成26年度	汚泥処理	脱水	機械	機器	No.6脱水機急速撹拌機修繕工事
131	平成26年度	汚泥処理	脱水	機械	機器	No.6脱水機混和槽ドレン配管増設
132	平成26年度	水処理	本館	電気	附帯	正門ｲﾝﾀｰﾎﾝ不通
133	平成26年度	水処理	砂ろ過	建築	その他	No.3砂濾過塔中央点検歩廊塗装修繕
134	平成26年度	水処理	初沈	機械	配管	4系生汚泥移送配管漏水
135	平成26年度	水処理	本館	その他	その他	来客用区画線修理工事
136	平成26年度	水処理	初沈	機械	機器	最初沈殿池クロスコレクタ・スプロケット修繕
137	平成26年度	水処理	砂ろ過	機械	ポンプ	No.2砂濾過給水ポンプ修繕
138	平成26年度	水処理	本館	機械	機器	代替空気源装置エアドライヤー新設工事
139	平成26年度	水処理	本館	土木	その他	テニスコート入口掘削及び基礎砕石工事
140	平成26年度	水処理	本館	土木	その他	テニスコート入口コンクリート打ち工事
141	平成26年度	水処理	本館	機械	機器	臭気ダクト改修工事
142	平成27年度	水処理	初沈	その他	その他	見学者通路転落防止柵
143	平成27年度	水処理	建設予定地	その他	その他	浄化センター内重機土掘削
144	平成27年度	汚泥処理	脱水	土木	舗装	ホッパー室西舗装修繕
145	平成27年度	汚泥処理	脱水	その他	防災	ハロン1301容器廻り銅管取替修繕
146	平成27年度	水処理	建設予定地	その他	その他	浄化センター内整地
147	平成27年度	水処理	住吉	電気	照明	住吉ポンプ場照明器具修繕
148	平成27年度	水処理	住吉	電気	制御	住吉ポンプ場リミットスイッチ修理
149	平成27年度	水処理	塩素	建築	附帯	塩滅棟北扉修理
150	平成27年度	水処理	住吉	建築	附帯	雨水ポンプ場流入ゲート横床修理
151	平成27年度	水処理	ｽｸﾘｰﾝ	電気	制御	投込式水位計修繕
152	平成27年度	水処理	住吉	電気	照明	照明器具（沈砂掻揚機）修理
153	平成27年度	汚泥処理	脱水	電気	制御	No.6汚泥脱水機薬品注入比率調整計ソフト作成・転送
154	平成27年度	水処理	本館	設備	配管	水質試験室実験用流台設置
155	平成27年度	水処理	本館	設備	配管	水質試験室実験用流台配管
156	平成27年度	汚泥処理	脱水	機械	配管	No.1、2薬品溶解タンク定量フィーダ部水漏れ修理
157	平成27年度	水処理	住吉	機械	附帯	住吉ポンプ場空調室内機電源組換
158	平成27年度	水処理	曝沈	建築	附帯	第1曝沈棟北扉修理
159	平成27年度	汚泥処理	脱水	機械	機器	No.1機械濃縮機凝集装置駆動側軸受交換
160	平成27年度	汚泥処理	脱水	電気	制御	機械濃縮機ショックモニタ交換
161	平成27年度	水処理	塩素	電気	照明	塩素滅菌棟照明修理
162	平成27年度	水処理	住吉	建築	その他	地下タンク北フェンス修理
